 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: Construção da Praça Adevanir João de Andrade (bairro São Gotardo). O projeto contempla a implantação de área de parque infantil, instalação de piso e de mobiliários urbanos, academia								BM - Data de Emissão: 09/07/2024				Empresa Contratada: J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI-ME			
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Professor Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, Bairro São Gotardo								BM - Período de Referência da Medição: 04/04/2024 até 08/07/2024				CNPJ: 18.973.779/0001-97			
		Concorrência Pública: 004/2021								Contrato: 079/2021				Valor da Medição: R\$ 168.627,52		BM - Número: 03	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Serviços a executar		
															Previsão no Orçamento	Executado acumulado até este BM	Executado no Período
CONTRATO ORIGINAL																	
1. PRACA SÃO GOTARDO																	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1114,71	R\$ 1.114,71	100,00%	1,00	R\$ 1.114,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.114,71	0,00	R\$ -	
1.1.2.	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	327,07	R\$ 327,07	100,00%	1,00	R\$ 327,07	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 327,07	0,00	R\$ -	
1.1.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	535,79	R\$ 535,79	100,00%	1,00	R\$ 535,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 535,79	0,00	R\$ -	
1.1.4.	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M2	565,62	2,39	R\$ 1.351,83	100,00%	565,62	R\$ 1.351,83	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	565,62	R\$ 1.351,83	0,00	R\$ -	
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	581,37	2,53	R\$ 1.470,87	100,00%	581,37	R\$ 1.470,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	581,37	R\$ 1.470,87	0,00	R\$ -	
1.1.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	581,37	3,3	R\$ 1.918,52	100,00%	581,37	R\$ 1.918,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	581,37	R\$ 1.918,52	0,00	R\$ -	
1.1.6.	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	565,62	7,23	R\$ 4.089,43	100,00%	565,62	R\$ 4.089,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	565,62	R\$ 4.089,43	0,00	R\$ -	
1.1.8.	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	M	112,28	142,39	R\$ 15.987,54	100,00%	112,28	R\$ 15.987,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	112,28	R\$ 15.987,54	0,00	R\$ -	
1.1.9.	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG	UN	1,00	5781,25	R\$ 5.781,25	100,00%	1,00	R\$ 5.781,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 5.781,25	0,00	R\$ -	
1.1.10.	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	3,00	510,69	R\$ 1.532,07	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	3,00	R\$ 1.532,07	100,00%	3,00	R\$ 1.532,07	0,00	R\$ -	
1.2. BANCOS DE ALVENARIA																	
1.2.1.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	26,03	98,87	R\$ 2.573,58	100,00%	26,03	R\$ 2.573,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	26,03	R\$ 2.573,58	0,00	R\$ -	
1.2.2.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	33,56	56,47	R\$ 1.895,12	100,00%	33,56	R\$ 1.895,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	33,56	R\$ 1.895,12	0,00	R\$ -	
1.2.3.	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	16,85	6,39	R\$ 107,67	100,00%	16,85	R\$ 107,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	16,85	R\$ 107,67	0,00	R\$ -	
1.2.4.	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	16,85	24,06	R\$ 405,41	100,00%	16,85	R\$ 405,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	16,85	R\$ 405,41	0,00	R\$ -	
1.2.5.	LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	16,85	76,57	R\$ 1.290,20	100,00%	16,85	R\$ 1.290,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	16,85	R\$ 1.290,20	0,00	R\$ -	
1.2.6.	BANCADA SIMPLES EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA	M2	22,74	212,81	R\$ 4.839,29	100,00%	22,74	R\$ 4.839,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	22,74	R\$ 4.839,29	0,00	R\$ -	
1.3. URBANIZAÇÃO																	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	112,28	36,1	R\$ 4.053,30	100,00%	112,28	R\$ 4.053,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	112,28	R\$ 4.053,30	0,00	R\$ -	
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	101,48	35,55	R\$ 3.607,61	100,00%	101,48	R\$ 3.607,61	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	101,48	R\$ 3.607,61	0,00	R\$ -	
1.3.3.	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	122,98	72,2	R\$ 8.879,16	100,00%	122,98	R\$ 8.879,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	122,98	R\$ 8.879,16	0,00	R\$ -	
1.3.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	173,14	12,52	R\$ 2.167,71	100,00%	173,14	R\$ 2.167,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	173,14	R\$ 2.167,71	0,00	R\$ -	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	Construção da Praça Adevanir João de Andrade (bairro São Gotardo). O projeto contempla a implantação de área de parque infantil, instalação de piso e de mobiliários urbanos, academia	BM - Data de Emissão:	09/07/2024	Empresa Contratada:	J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Professor Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, Bairro São Gotardo	BM - Período de Referência da Medição:	04/04/2024 até 08/07/2024	CNPJ:	18.973.779/0001-97
Concorrência Pública:	004/2021	Contrato:	079/2021	Valor da Medição:	R\$ 168.627,52
				BM - Número:	03
				Valor do Contrato:	R\$ 325.837,67
				Valor Medido Acumulado:	R\$ 325.837,67

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
				Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)		
1.3.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	173,14	23,69	R\$ 4.101,67	100,00%	173,14	R\$ 4.101,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	173,14	R\$ 4.101,67	0,00	R\$ -		
1.3.6.	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	173,14	75,66	R\$ 13.099,77	100,00%	173,14	R\$ 13.099,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	173,14	R\$ 13.099,77	0,00	R\$ -		
1.3.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	117,1	12,52	R\$ 1.466,09	100,00%	117,10	R\$ 1.466,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	117,10	R\$ 1.466,09	0,00	R\$ -		
1.3.8.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	117,1	23,69	R\$ 2.774,09	100,00%	117,10	R\$ 2.774,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	117,10	R\$ 2.774,09	0,00	R\$ -		
1.3.9.	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	44,1	44,67	R\$ 1.969,93	100,00%	44,10	R\$ 1.969,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	44,10	R\$ 1.969,93	0,00	R\$ -		
1.3.10.	PISO CIMENTADO COM PIGMENTAÇÃO COLORIDA, DESEMPENADO E FELTRADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	73,00	37,67	R\$ 2.749,91	100,00%	73,00	R\$ 2.749,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	73,00	R\$ 2.749,91	0,00	R\$ -		
1.3.11.	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	234,2	0,36	R\$ 84,31	100,00%	234,20	R\$ 84,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	234,20	R\$ 84,31	0,00	R\$ -		
1.3.12.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	40,34	12,52	R\$ 505,06	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	40,34	R\$ 505,06	100,00%	40,34	R\$ 505,06	0,00	R\$ -		
1.3.13.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	40,34	23,69	R\$ 955,65	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	40,34	R\$ 955,65	100,00%	40,34	R\$ 955,65	0,00	R\$ -		
1.3.14.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	161,35	R\$ 99,00	R\$ 15.973,65	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	161,35	R\$ 15.973,65	100,00%	161,35	R\$ 15.973,65	0,00	R\$ -		
1.3.15.	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	3,00	294,94	R\$ 884,82	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	3,00	R\$ 884,82	100,00%	3,00	R\$ 884,82	0,00	R\$ -		
1.4.	ESCALADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.1.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,59	436,04	R\$ 1.129,34	100,00%	2,59	R\$ 1.129,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,59	R\$ 1.129,34	0,00	R\$ -		
1.4.2.	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,9	38,59	R\$ 613,58	100,00%	15,90	R\$ 613,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	15,90	R\$ 613,58	0,00	R\$ -		
1.4.3.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	111,49	7,83	R\$ 872,96	100,00%	111,49	R\$ 872,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	111,49	R\$ 872,96	0,00	R\$ -		
1.4.4.	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	2,86	340,7	R\$ 974,40	100,00%	2,86	R\$ 974,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,86	R\$ 974,40	0,00	R\$ -		
1.4.5.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	16,32	24,64	R\$ 402,12	100,00%	16,32	R\$ 402,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	16,32	R\$ 402,12	0,00	R\$ -		
1.5.	GUARDA-CORPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	M	77,11	353,69	R\$ 27.273,03	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	77,11	R\$ 27.273,03	100,00%	77,11	R\$ 27.273,03	0,00	R\$ -		
1.5.2.	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	8,96	429,6	R\$ 3.849,21	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	8,96	R\$ 3.849,21	100,00%	8,96	R\$ 3.849,21	0,00	R\$ -		
1.5.3.	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	4,48	513,9	R\$ 2.302,26	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	4,48	R\$ 2.302,26	100,00%	4,48	R\$ 2.302,26	0,00	R\$ -		
1.5.4.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	96,89	3,86	R\$ 374,00	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	96,89	R\$ 374,00	100,00%	96,89	R\$ 374,00	0,00	R\$ -		
1.5.5.	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	96,89	27,32	R\$ 2.647,03	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	96,89	R\$ 2.647,03	100,00%	96,89	R\$ 2.647,03	0,00	R\$ -		
1.6.	MICRODRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	Construção da Praça Adevanir João de Andrade (bairro São Gotardo). O projeto contempla a implantação de área de parque infantil, instalação de piso e de mobiliários urbanos, academia	BM - Data de Emissão:	09/07/2024	Empresa Contratada:	J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Professor Odaílea Oliveira Moraes de Azevedo, Bairro São Gotardo	BM - Período de Referência da Medição:	04/04/2024 até 08/07/2024	CNPJ:	18.973.779/0001-97
Concorrência Pública:	004/2021	Contrato:	079/2021	Valor da Medição:	RS 168.627,52
				BM - Número:	03
				Valor do Contrato:	RS 325.837,67
				Valor Medido Acumulado:	RS 325.837,67

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unid. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
						%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	
1.6.1.	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	32,86	52,24	RS 1.716,60	100,00%	32,86	RS 1.716,60	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	32,86	RS 1.716,60	0,00	RS -	
1.6.2.	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO D (D = 70 CM, H = 82 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	8,00	573,68	RS 4.589,44	100,00%	8,00	RS 4.589,44	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	8,00	RS 4.589,44	0,00	RS -	
1.6.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,05	27,8	RS 473,99	100,00%	17,05	RS 473,99	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	17,05	RS 473,99	0,00	RS -	
1.7.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	152,67	RS 152,67	100,00%	1,00	RS 152,67	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 152,67	0,00	RS -	
1.7.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,96	19,46	RS 57,60	100,00%	2,96	RS 57,60	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,96	RS 57,60	0,00	RS -	
1.7.3.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2") ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	393,59	RS 393,59	100,00%	1,00	RS 393,59	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 393,59	0,00	RS -	
1.7.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,1	20,73	RS 43,53	100,00%	2,10	RS 43,53	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,10	RS 43,53	0,00	RS -	
1.7.5.	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREIADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	154,90	RS 154,90	100,00%	1,00	RS 154,90	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 154,90	0,00	RS -	
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	200,00	9,69	RS 1.938,00	100,00%	200,00	RS 1.938,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	200,00	RS 1.938,00	0,00	RS -	
1.8.2.	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO	UN	10,00	187,59	RS 1.875,90	100,00%	10,00	RS 1.875,90	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	10,00	RS 1.875,90	0,00	RS -	
1.8.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 2 BRACOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E 2 LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	7,00	2218,59	RS 15.530,13	0,00%	0,00	RS -	100,00%	7,00	RS 15.530,13	100,00%	7,00	RS 15.530,13	0,00	RS -	
1.8.4.	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	100,00	21,5	RS 2.150,00	100,00%	100,00	RS 2.150,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	100,00	RS 2.150,00	0,00	RS -	
1.8.5.	ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW	U	1,00	954,11	RS 954,11	100,00%	1,00	RS 954,11	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 954,11	0,00	RS -	
1.9.	COMPLEMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	662,87	RS 2.651,48	100,00%	4,00	RS 2.651,48	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 2.651,48	0,00	RS -	
1.9.2.	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1121,34	RS 1.121,34	100,00%	1,00	RS 1.121,34	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 1.121,34	0,00	RS -	
1.9.3.	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3450,9	RS 3.450,90	100,00%	1,00	RS 3.450,90	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 3.450,90	0,00	RS -	
1.9.4.	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1300,42	RS 1.300,42	100,00%	1,00	RS 1.300,42	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 1.300,42	0,00	RS -	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Construção da Praça Adevaír João de Andrade (bairro São Gotardo). O projeto contempla a implantação de área de parque infantil, instalação de piso e de mobiliários urbanos, academia	BM - Data de Emissão: 09/07/2024	Empresa Contratada: J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI-ME
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Professor Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, Bairro São Gotardo	BM - Período de Referência da Medição: 04/04/2024 até 08/07/2024	CNPJ: 18.973.779/0001-97
Concorrência Pública: 004/2021	Valor da Medição: R\$ 168.627,52	Valor do Contrato: R\$ 325.837,67
Contrato: 079/2021	BM - Número: 03	Valor Medido Acumulado: R\$ 325.837,67

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
				Preço Unil. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)		
1.9.5.	ROTACAO VERTICAL DUPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	988,65	R\$ 988,65	100,00%	1,00	R\$ 988,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 988,65	0,00	R\$ -					
1.9.6.	PRESSAO DE PERNAS TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2122,73	R\$ 2.122,73	100,00%	1,00	R\$ 2.122,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 2.122,73	0,00	R\$ -					
1.9.7.	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1384,15	R\$ 1.384,15	100,00%	1,00	R\$ 1.384,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.384,15	0,00	R\$ -					
1.9.8.	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2568,6	R\$ 2.568,60	100,00%	1,00	R\$ 2.568,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 2.568,60	0,00	R\$ -					
1.9.9.	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.775,75	R\$ 2.775,75	100,00%	1,00	R\$ 2.775,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 2.775,75	0,00	R\$ -					
1.9.10.	ESQUI TRIPL0, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3231,47	R\$ 3.231,47	100,00%	1,00	R\$ 3.231,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 3.231,47	0,00	R\$ -					
1.9.11.	PLAYGROUND DE MADEIRA COM ESCORREGADOR, GANGORRA, ESCADA HORIZONTAL, BALANÇOS DE PNEU, PAR DE ARGOLAS, GANGORRA VAI E VEM, BARRA, BALANÇOS, ESCADA VERTICAL, CANO PARA ESCORREGAR TIPO "BOMBEIROS", CASA PANORÂMICA COM COBERTURA EM TELHAS E CERCADA POR RIPAS DE MADEIRA	UN.	1,00	5010,77	R\$ 5.010,77	100,00%	1,00	R\$ 5.010,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 5.010,77	0,00	R\$ -					
1.10.	PAISAGISMO																				
1.10.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	174,65	8,2	R\$ 1.432,13	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	174,65	R\$ 1.432,13	100,00%	174,65	R\$ 1.432,13	0,00	R\$ -					
1.10.2.	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	3,00	9,64	R\$ 28,92	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	3,00	R\$ 28,92	100,00%	3,00	R\$ 28,92	0,00	R\$ -					
1.10.3.	FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS	U	3,00	22,6	R\$ 67,80	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	3,00	R\$ 67,80	100,00%	3,00	R\$ 67,80	0,00	R\$ -					
1.11.	LIMPEZA FINAL																				
1.11.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	339,74	0,57	R\$ 193,65	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	339,74	R\$ 193,65	100,00%	339,74	R\$ 193,65	0,00	R\$ -					
TOTAL GERAL					R\$ 207.290,23			R\$ 133.740,82			R\$ 73.549,41			R\$ 207.290,23		R\$ -					

7º TERMO ADITIVO - REEQUILIBRIO

1 REEQUILIBRIO																		
1.1	REEQUILIBRIO	UN	1,00	R\$ 118.547,44	R\$ 118.547,44	19,80%	0,20	R\$ 23.469,33	80,20%	0,80200	R\$ 95.078,11	100,00%	1,00000	R\$ 118.547,44	0,00000	R\$ -		
TOTAL GERAL					R\$ 118.547,44			R\$ 157.210,15			R\$ 168.627,52			R\$ 325.837,67		R\$ 0,00		

Jorge Feres
Representante Legal do Município
Secretário Municipal de Obras Públicas

Vinícius Tofani Cruz
Cargo do Setor de Infraestrutura
CREA Nº: 177324/D

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Vinícius Tofani Cruz
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA MG 211590/D

Assinado de forma digital por
EVANDRO MOURA CORREA
CORREA
FONSECA:104495
88637
Evandro Moura Correa Fonseca
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA MG 41286/D

Assinado de forma digital por
ESTEVAO PEDROSA JUNIOR:04885477689
DADOS: 2024.07.19 13:50:50 -03'00'
ESTEVAO PEDROSA JUNIOR
Sócio Administrador
J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI-ME



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto do Contrato: Construção da Praça Adevanir João de Andrade (bairro São Gotardo). O projeto contempla a implantação de área de parque infantil, instalação de piso e de mobiliários urbanos, academia popular e instalação de iluminação

BM - Data de Emissão: 09/07/2024

Empresa Contratada:

J.A.A.
CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGENS
EIRELI-ME

BM - Período de Referência da Medição: 04/04/2024 até 08/07/2024

CNPJ: 18.973.779/0001-97

Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Professor Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, Bairro São Gotardo

Início da Obra: 01/08/2023

Valor do Contrato: R\$ 325.837,67

Concorrência Pública:

004/2021

Contrato:

079/2021

Valor da Medição:


R\$ 168.627,52

BM - Número: 03



Valor Medido Acumulado: R\$ 325.837,67

Item	Descrição	Unid.	Quant.																													
CONTRATO ORIGINAL																																
1.	PRAÇA SÃO GOTARDO																															
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																															
1.1.10.	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	3																													
1.2.	BANCOS DE ALVENARIA																															
1.3.	URBANIZAÇÃO																															
1.3.12.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	40,34																													
1.3.13.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF	M2	40,34																													
1.3.14.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	161,35																													
1.3.15.	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	3,00																													
1.4.	ESCADA																															
1.5.	GUARDA-CORPO																															
1.5.1.	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	M	77,11																													
1.5.2.	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1M		8,96																													
1.5.3.	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 M		4,48																													
1.5.4.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	96,89																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Quantidade (M)</th> <th>Comprimento (M)</th> <th>Desenvolvimento (M)</th> <th>Área (M2)</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MF3</td> <td>1</td> <td>77,11</td> <td>1,07</td> <td>82,51</td> <td rowspan="3">Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento</td> </tr> <tr> <td>MF4</td> <td>1</td> <td>8,96</td> <td>1,07</td> <td>9,59</td> </tr> <tr> <td>GC5</td> <td>1</td> <td>4,48</td> <td>1,07</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>96,89</td> <td>M2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Quantidade (M)	Comprimento (M)	Desenvolvimento (M)	Área (M2)	Fórmula	MF3	1	77,11	1,07	82,51	Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento	MF4	1	8,96	1,07	9,59	GC5	1	4,48	1,07	4,80	TOTAL:				96,89	M2			
Elemento	Quantidade (M)	Comprimento (M)	Desenvolvimento (M)	Área (M2)	Fórmula																											
MF3	1	77,11	1,07	82,51	Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento																											
MF4	1	8,96	1,07	9,59																												
GC5	1	4,48	1,07	4,80																												
TOTAL:				96,89	M2																											
1.5.5.	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	96,89																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Quantidade (M)</th> <th>Comprimento (M)</th> <th>Desenvolvimento (M)</th> <th>Área (M2)</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MF3</td> <td>1</td> <td>77,11</td> <td>1,07</td> <td>82,51</td> <td rowspan="3">Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento</td> </tr> <tr> <td>MF4</td> <td>1</td> <td>8,96</td> <td>1,07</td> <td>9,59</td> </tr> <tr> <td>GC5</td> <td>1</td> <td>4,48</td> <td>1,07</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>96,89</td> <td>M2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Quantidade (M)	Comprimento (M)	Desenvolvimento (M)	Área (M2)	Fórmula	MF3	1	77,11	1,07	82,51	Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento	MF4	1	8,96	1,07	9,59	GC5	1	4,48	1,07	4,80	TOTAL:				96,89	M2			
Elemento	Quantidade (M)	Comprimento (M)	Desenvolvimento (M)	Área (M2)	Fórmula																											
MF3	1	77,11	1,07	82,51	Quantidade x Comprimento x Desenvolvimento																											
MF4	1	8,96	1,07	9,59																												
GC5	1	4,48	1,07	4,80																												
TOTAL:				96,89	M2																											
1.6.	MICRODRENAGEM																															
1.7.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO																															
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																															
1.8.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 2 BRAÇUN.		7,00																													
1.9.	COMPLEMENTOS																															
1.10.	PAISAGISMO																															
1.10.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	174,65																													
1.10.2.	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	3,00																													
1.10.3.	FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS	U	3,00																													

1.11.	LIMPEZA FINAL			
-------	---------------	--	--	--

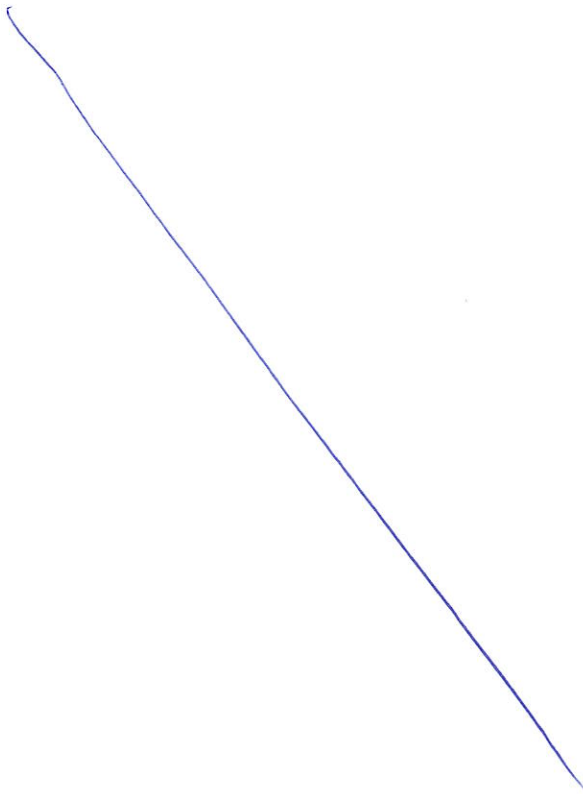

Handwritten signature or initials in blue ink.

1.11.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	339,74																																				
7º TERMO ADITIVO - REEQUILIBRIO																																							
1	REEQUILIBRIO																																						
1.1	REEQUILIBRIO	UN	0,80200																																				
<p>TOTAL EQUIVALENTE AO BM 02</p> <table> <tr> <td>TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:</td> <td>R\$ 207.290,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILIBRIO:</td> <td>R\$ 118.547,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DE REEQUILIBRIO:</td> <td>57,19%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:</td> <td>R\$ 92.702,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:</td> <td>R\$ 53.015,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:</td> <td>0,4472</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">NO BM 02 NÃO FOI MEDIDO O REEQUILIBRIO, SENDO MEDIDO AGORA NA MEDIÇÃO FINAL (BM 03)</p> <p>TOTAL EQUIVALENTE AO BM 03</p> <table> <tr> <td>TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:</td> <td>R\$ 207.290,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILIBRIO:</td> <td>R\$ 118.547,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DE REEQUILIBRIO:</td> <td>57,19%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:</td> <td>R\$ 73.549,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:</td> <td>R\$ 42.062,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:</td> <td>0,3548</td> <td></td> </tr> </table>				TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 207.290,23		TOTAL DO REEQUILIBRIO:	R\$ 118.547,44		% DE REEQUILIBRIO:	57,19%		TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 92.702,71		TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 53.015,86		QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,4472		TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 207.290,23		TOTAL DO REEQUILIBRIO:	R\$ 118.547,44		% DE REEQUILIBRIO:	57,19%		TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 73.549,41		TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 42.062,25		QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,3548	
TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 207.290,23																																						
TOTAL DO REEQUILIBRIO:	R\$ 118.547,44																																						
% DE REEQUILIBRIO:	57,19%																																						
TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 92.702,71																																						
TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 53.015,86																																						
QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,4472																																						
TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 207.290,23																																						
TOTAL DO REEQUILIBRIO:	R\$ 118.547,44																																						
% DE REEQUILIBRIO:	57,19%																																						
TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 73.549,41																																						
TOTAL DO REEQUILIBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 42.062,25																																						
QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,3548																																						
 Jorge Feres Filho Representante Legal do Município Secretário Municipal de Obras Públicas		 Apin do Carmo Mendonça Chefe do Setor de Infraestrutura CREA Nº: 177324/D																																					
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637																																					
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 88637		Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2024.07.19 13:51:59 -03'00'																																					
Evandro Moura Correa Fonseca Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA MG 41295/D		ESTEVAO PEDROSA JUNIOR:04885477689 85477689 Assinado de forma digital por ESTEVAO PEDROSA JUNIOR:04885477689 Dados: 2024.07.19 13:52:17 -03'00'																																					
Estevão Pedrosa Junior Sócio Administrador J.A.A. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELHME																																							
