

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTACÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRANÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTÊINERES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG (PMIA) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 06/08/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97			
										BM - Período de Referência da Medição: 24/06/2025 - 06/08/2025							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 12/05/2025		BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		Valor do Contrato: R\$ 60.005,53			
		ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		RS 25.725,10		Valor Medido Acumulado: R\$ 60.005,53			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	
OS 002 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUADRA DO INCONFIDÊNCIA																	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	RS 2.722,10	RS 2.722,10	57,00%	0,57	RS 1.551,87	43,00%	0,4299	RS 1.170,23	100,00%	1,00	RS 2.722,10	-	RS 0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	RS 263,71	RS 791,13	100,00%	3,00	RS 791,13	0%	0,0000	RS 0,00	100%	3,00	RS 791,13	-	RS 0,00	
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	4,00	RS 4,38	RS 17,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	4,0000	RS 17,52	100%	4,00	RS 17,52	-	RS 0,00	
2.3	PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	34,00	RS 9,46	RS 321,64	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	34,0000	RS 321,64	100%	34,00	RS 321,64	-	RS 0,00	
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO																
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	143,27	RS 8,84	RS 1.266,53	100,00%	143,27	RS 1.266,53	0%	0,0000	RS 0,00	100%	143,27	RS 1.266,53	-	RS 0,00	
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	89,15	RS 14,73	RS 1.313,18	100,00%	89,15	RS 1.313,18	0%	0,0000	RS 0,00	100%	89,15	RS 1.313,18	-	RS 0,00	
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	1,20	RS 43,33	RS 52,00	100,00%	1,20	RS 52,00	0%	0,0000	RS 0,00	100%	1,20	RS 52,00	-	RS 0,00	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	4,73	RS 35,62	RS 168,30	100,00%	4,73	RS 168,30	0%	0,0000	RS 0,00	100%	4,73	RS 168,30	-	RS 0,00	
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_09/2024	M3	4,73	RS 5,48	RS 25,89	100,00%	4,73	RS 25,89	0%	0,0000	RS 0,00	100%	4,73	RS 25,89	-	RS 0,00	
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,91	RS 5,48	RS 32,37	100,00%	5,91	RS 32,37	0%	0,0000	RS 0,00	100%	5,91	RS 32,37	-	RS 0,00	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	29,53	RS 1,61	RS 47,55	100,00%	29,53	RS 47,55	0%	0,0000	RS 0,00	100%	29,53	RS 17,55	-	RS 0,00	
5	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																
5.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	11,06	RS 35,66	RS 394,50	100,00%	11,06	RS 394,50	0%	0,0000	RS 0,00	100%	11,06	RS 394,50	-	RS 0,00	
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	11,06	RS 21,09	RS 233,32	100,00%	11,06	RS 233,32	0%	0,0000	RS 0,00	100%	11,06	RS 233,32	-	RS 0,00	
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	11,06	RS 65,49	RS 724,51	100,00%	11,06	RS 724,51	0%	0,0000	RS 0,00	100%	11,06	RS 724,51	-	RS 0,00	
6	ESTRUTURA																



Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONEXÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSULMOS E MAO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 06/08/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 18.973.779/0001-97	
										BM - Período de Referência da Medição: 24/06/2025 - 06/08/2025						Valor do Contrato: R\$ 60.005,53	
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 12/05/2025		BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		Valor Medido Acumulado: R\$ 60.005,53			
ORDEM DE SERVIÇO:		002/AR/P-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 25.725,10							
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
6.1	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	44,23	R\$ 51,75	R\$ 2.288,70	100,00%	44,23	R\$ 2.288,70	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	44,23	R\$ 2.288,70	-	R\$ 0,00	
6.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	54,21	R\$ 10,70	R\$ 580,03	100,00%	54,21	R\$ 580,03	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	54,21	R\$ 580,03	-	R\$ 0,00	
6.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	194,65	R\$ 10,15	R\$ 1.975,71	100,00%	194,65	R\$ 1.975,71	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	194,65	R\$ 1.975,71	-	R\$ 0,00	
6.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,34	R\$ 673,33	R\$ 2.251,55	100,00%	3,34	R\$ 2.251,55	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	3,34	R\$ 2.251,55	-	R\$ 0,00	
7	ALVENARIA E REVESTIMENTO DO MURO																
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	36,25	R\$ 84,38	R\$ 3.058,78	100,00%	36,25	R\$ 3.058,78	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	36,25	R\$ 3.058,78	-	R\$ 0,00	
7.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	306,76	R\$ 8,16	R\$ 2.503,16	100,00%	306,76	R\$ 2.503,16	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	306,76	R\$ 2.503,16	-	R\$ 0,00	
7.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	306,76	R\$ 28,02	R\$ 8.595,42	100,00%	306,76	R\$ 8.595,42	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	306,76	R\$ 8.595,42	-	R\$ 0,00	
7.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	100,37	R\$ 2,72	R\$ 273,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	100,3700	R\$ 273,01	100%	100,37	R\$ 273,01	-	R\$ 0,00	
7.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	414,48	R\$ 3,58	R\$ 1.483,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	414,4800	R\$ 1.483,84	100%	414,48	R\$ 1.483,84	-	R\$ 0,00	
7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	414,48	R\$ 11,10	R\$ 4.600,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	414,4800	R\$ 4.600,73	100%	414,48	R\$ 4.600,73	-	R\$ 0,00	
8	PISO EXTERNO																
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,15	R\$ 72,08	R\$ 6.425,93	100,00%	89,15	R\$ 6.425,93	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	89,15	R\$ 6.425,93	-	R\$ 0,00	
9	PISO DA QUADRA																
9.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	610,18	R\$ 2,83	R\$ 1.726,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	610,1800	R\$ 1.726,81	100%	610,18	R\$ 1.726,81	-	R\$ 0,00	
9.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	610,18	R\$ 18,03	R\$ 11.001,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	610,1800	R\$ 11.001,55	100%	610,18	R\$ 11.001,55	-	R\$ 0,00	
9.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	277,31	R\$ 9,12	R\$ 2.529,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	277,3134	R\$ 2.529,10	100%	277,31	R\$ 2.529,10	-	R\$ 0,00	
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 57.404,86				R\$ 34.280,43		R\$ 23.124,43				R\$ 57.404,86		R\$ 0,00	
OS 002 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUADRA DO INCONFIDÊNCIA - ADITIVO																	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,04	R\$ 2.722,10	R\$ 103,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,0379	R\$ 103,25	100%	0,04	R\$ 103,25	-	R\$ 0,00	
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO																
3.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	38,45	R\$ 0,39	R\$ 15,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	38,4500	R\$ 15,00	100%	38,45	R\$ 15,00	-	R\$ 0,00	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão:		06/08/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 18.973.779/0001-97		
										BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025							
										Início da Obra: 12/05/2025		BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)							
										Valor do Contrato: RS 60.005,53		Valor Medido Acumulado: RS 60.005,53							
Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Valor da Medição: RS 25.725,10											
ORDEM DE SERVIÇO:				002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025											
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit.com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2,89	RS 35,62	RS 102,91	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	2,8890	RS 102,91	100%	2,89	RS 102,91	-	RS 0,00			
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,37	RS 5,48	RS 2,01	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	0,3661	RS 2,01	100%	0,37	RS 2,01	-	RS 0,00			
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,83	RS 1,61	RS 2,95	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	1,8303	RS 2,95	100%	1,83	RS 2,95	-	RS 0,00			
4.5	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	3,25	RS 60,82	RS 197,37	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	3,2452	RS 197,37	100%	3,25	RS 197,37	-	RS 0,00			
5	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																		
5.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0,23	RS 35,66	RS 8,30	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	0,2327	RS 8,30	100%	0,23	RS 8,30	-	RS 0,00			
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,23	RS 21,09	RS 4,91	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	0,2327	RS 4,91	100%	0,23	RS 4,91	-	RS 0,00			
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	0,23	RS 65,49	RS 15,24	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	0,2327	RS 15,24	100%	0,23	RS 15,24	-	RS 0,00			
10	DRENAGEM																		
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,15	RS 53,37	RS 221,49	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	4,1500	RS 221,49	100%	4,15	RS 221,49	-	RS 0,00			
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,95	RS 28,89	RS 807,48	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	27,9500	RS 807,48	100%	27,95	RS 807,48	-	RS 0,00			
10.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,50	RS 13,93	RS 146,27	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	10,5000	RS 146,27	100%	10,50	RS 146,27	-	RS 0,00			
10.4	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	RS 450,11	RS 450,11	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	1,0000	RS 450,11	100%	1,00	RS 450,11	-	RS 0,00			
10.5	GRELHA DE PVC, QUADRADA, ACABAMENTO BRANCO, 100 DE DIÂMETRO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	8,00	RS 11,38	RS 91,04	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	8,0000	RS 91,04	100%	8,00	RS 91,04	-	RS 0,00			
TOTAL DO SERVIÇO:				RS 2.168,33				RS 0,00				RS 2.168,33				RS 2.168,33		RS 0,00	

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76  		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDIÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 06/08/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA							
										BM - Período de Referência da Medição: 24/06/2025 - 06/08/2025									
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BARRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 12/05/2025		BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		CNPJ: 18.973.779/0001-97					
ORDEN DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Valor da Medição: R\$ 25.725,10		Valor do Contrato: R\$ 60.005,53		Valor Medido Acumulado: R\$ 60.005,53											
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
OS 002 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUADRA DO INCONFIDÊNCIA - ADITIVO																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,01	R\$ 2.722,10	R\$ 20,59	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,0100	R\$ 20,59	100%	0,01	R\$ 20,59	-	R\$ 0,00			
8	PISO EXTERNO	m2	37,50	R\$ 10,98	R\$ 411,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	37,5000	R\$ 411,75	100%	37,50	R\$ 411,75	-	R\$ 0,00			
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 432,34	R\$ 0,00				R\$ 432,34				R\$ 432,34				R\$ 0,00		
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 60.005,53	R\$ 34.280,43				R\$ 25.725,10				R\$ 60.005,53				R\$ 0,00		
Observações:																			
JORGES BARBOSA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Obras, Planejamento e Urbanismo		LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383356/MG				EVANDRO MOURA CORREA FONSECA 1044958863 7 Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA 1044958863 Data: 2025.08.12 13:20:59 -0300				VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.08.12 13:20:59 -0300				ISABELLA ALVES SOUZA MOURA 12997071282 Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUZA MOURA 12997071282 Data: 2025.08.12 13:20:59 -0300					



Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-02 (OS 002- QUADRA INCONFIDÊN- CIA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG			
ORDEM DE SERVIÇO:	002/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:	06/08/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:	24/06/2025 – 06/08/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	

BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-02 (OS 002 QUADRA INCONFIDÊNCIA)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		06/08/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97	
		Total:		100,37			
7.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023					M2	414,48
	Elemento	Largura	Comprimento	Altura	Lados	Área	Unidade
	ta (lado menor- c	0,2	20,65	1,1	2	49,56	
	ureta (lado menc	0,2	20,65	1,1	2	49,56	
	eta (lado maior) t	0,15	30,45	1,1	2	71,56	
	ureta (lado maio	0,25	30,45	0,6	2	44,15	
	reta parte alta lat	0,2	2,45	2,8	4	27,93	
	Subtotal					242,76	M2
		Piso/ espelho	Comprimento	Área	Unidade		
	Arquibancada (pis	1,4	26	36,4			
	Arquibancada (espe	0,8	26	20,8			
	Subtotal					57,2	M2
	Elemento	Área	Lados	Área total	Unidade		
	Fachada existente	22,59	1	22,59			
	Fachada fechamento - esquerda	12,10	1	12,10			
	fechamento - direita	2,40	1	2,40			
	Mureta fachada - esquerda	16,89	2	33,78			
	Mureta fachada - direita	18,23	2	36,46			
	Mureta parte superior - espessura	7,19	1	7,19			
Subtotal						114,52	M2
Total					414,48		
7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					M2	414,48
8 PISO EXTERNO							
9 PISO DA QUADRA							
9.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021					M2	610,18
	Elemento	Área	Unidade				
	Quadra	610,18					



Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG					
ORDEN DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		06/08/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97	
		Total:		610,18		M2	
9.2		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO				M2 610,18	
9.3		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,				M 277,31	
		Elemento		Comprimento		Unidade	
		retangulo maior		91,12			
		retangulo menor		54,00			
		linha do meio		17,54			
		linhas verticais		18,00			
		circulo do meio maior		18,85			
		círculo do meio meno		12,57			
		círculo das áreas		34,56			
		garrafão		30,68			
		Total:		277,31		M	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN 0,04	
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN 0,04	
		Critérios da Administração			Qtde		
		Administração adotada por obra em:		URBANO	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00	
					Total:	1,00	UN
		Acréscimo					
		Descrição		Adm adotada (%)	Valor Acréscimo	ADM acréscimo	Unidade
		Administração Local do ACRÉSCIMO		5,00%	R\$ 2.065,08	R\$ 103,25	
		Total:			103,25	R\$	
		Acréscimo					
		Descrição		Adm Acréscimo	ADM Adotada	ADM local	Unidade
		Administração local		R\$ 103,25	R\$ 2.722,10	0,04	
		Total:			0,04		
3		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO					
		REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M 38,45	
		Acréscimo					
		Elemento		Comprimento		Unidade	



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		06/08/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97		
3.4			Remoção de tubulação 40 mm	10,50			
			Remoção de tubulação pluvial 100 mm	27,95			
			Total:	38,45	M		
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO				M3	2,89	
	Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Volume	Unidade	
	Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	4,73		
				Total:	4,73	M3	
	Acréscimo						
	Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Volume	Unidade	
	Escavação tubulação 100	27,95	0,3	0,30	2,52		
	Escavação tubulação 150	4,15	0,3	0,30	0,37		
				Total:	2,89	M3	
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				M3	0,37	
	Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Empolamento (25%)	Volume	Unidade
	Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	1,25	5,91	
				Total:	5,91	M3	
	Acréscimo						
	Elemento	Comprimento	Área (PIXR²)	Empolamento (25%)	Volume		
	Volume da Tubulação 100	27,95	0,008	1,250	0,27		
	Volume da Tubulação 150	4,15	0,018	1,250	0,09		
				Total:	0,37	M3	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	1,83	
	Elemento	Volume	Distância (km)	M3 X KM	Unidade		
	Solo para a mureta	5,91	5	29,53			
			Total:	29,53	M3		



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)
Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG	

ORDEM DE SERVIÇO:	002/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
BM - Data de Emissão:	06/08/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	24/06/2025 – 06/08/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97

4.4	Acréscimo				
	Elemento	Volume	Distância (km)	M3 X KM	Unidade
	Volume da tubulação	0,37	5	1,83	
			Total:	1,83	M3

	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	3,25
--	--	----	------

4.5	Acréscimo					
	Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Empolamento(25%)	Volume
	avacção tubulaçã	27,95	0,3	0,30	1,25	3,14
	avacção tubulaçã	4,15	0,3	0,30	1,25	0,47
	Elemento	Comprimento	Área (PIXR²)	Empolamento (25%)	Volume	
	Volume da Tubulação 10	27,95	0,008	1,25	0,27	
	Volume da Tubulação 15	4,15	0,018	1,25	0,09	
				Total (Volume escavado - Volume da tubulação)	3,25	M3

5	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
---	--

	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0,23
--	--	----	------

5.1	Elemento	Área	Espessura	Empolamento (40%)	Volume	
	Piso de lajota ceramica	89,15	0,035	1,4	4,37	
	Mureta - reboco	143,27	0,025	1,4	5,01	
	Mureta alvenaria	6,00	0,20	1,4	1,68	
				Total:	11,06	M3

	Acréscimo			
	Elemento	Comprimento	Área	Volume
	Remoção de tubulação 40 mm	10,50	0,00	0,01
	Remoção de tubulação pluvial 100 mm	27,95	0,01	0,22
			Total:	0,23



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-02 (OS 002 QUADRA INCONFIDÊNCIA)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG			
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		06/08/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA			M3	0,23
	Acréscimo				
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA			M3	0,23
	Acréscimo				
10	DRENAGEM				
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE			M	4,15
	Acréscimo				
	Elemento	Comprimento	Unidade		
	Drenam (tubo de 150	4,15			
	Total:	4,15	M		
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	27,95
	Acréscimo				
	Elemento	Comprimento	Unidade		
	Drenagem (tubo de 100	27,95			
	Total:	27,95	M		
10.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			M	10,50
	Acréscimo				
	Elemento	Quantidade	Comprimento	Compr Total	Unidade
	Tubo de 40	6	1,75	10,50	
		Total:	10,50	M	
10.4	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)			UN	1,00
	Acréscimo				
	Elemento	Quantidade	Unidade		
	Caixa de drenagem	1			



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)									
Local da Obra (Bairro, município e UF):		BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG												
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025									
BM - Data de Emissão:		06/08/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA									
BM - Período de Referência da Medição:		24/06/2025 – 06/08/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97								
		Total:		1,00	UN									
10.5	GRELHA DE PVC, QUADRADA, ACABAMENTO BRANCO, 100 DE DIÂMETRO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL				UN	8,00								
Acréscimo <table><tr><th>Elemento</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Grelhas quadradas 100r</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>8,00</td><td>UN</td></tr></table>						Elemento	Quantidade	Unidade	Grelhas quadradas 100r	8		Total:	8,00	UN
Elemento	Quantidade	Unidade												
Grelhas quadradas 100r	8													
Total:	8,00	UN												

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	0,01
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
	Critérios da Administração			Qtde		
	Administração adotada por obra em:	URBANO	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00		
			Total:	1,00	UN	
	Acréscimo					
	Descrição	Adm adotada (%)	Valor Acréscimo	ADM acréscimo	Unidade	
	Administração Local do ACRÉSCIMO	5,00%	R\$ 411,75	R\$ 20,59		
	Total:			20,59	R\$	
	Acréscimo					
	Descrição	Adm Acréscimo	ADM Adotada	ADM local	Unidade	
Administração local	R\$ 20,59	R\$ 2.722,10	0,01			
Total:			0,01			



Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-02 (OS 002- QUADRA INCONFIDÊN- CIA												
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG														
ORDEM DE SERVIÇO:	002/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025													
BM - Data de Emissão:	06/08/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA													
BM - Período de Referência da Medição:	24/06/2025 – 06/08/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97												
8	PISO EXTERNO															
8.2	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS		m2	37,50												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Acréscimo</th> </tr> <tr> <th>Elemento</th> <th>área</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piso externo de concreto (área entre a arquibancada e a quadra</td> <td>37,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>37,50</td> <td>m2</td> </tr> </tbody> </table>				Acréscimo			Elemento	área	Unidade	Piso externo de concreto (área entre a arquibancada e a quadra	37,50		Total:	37,50	m2
	Acréscimo															
	Elemento	área	Unidade													
Piso externo de concreto (área entre a arquibancada e a quadra	37,50															
Total:	37,50	m2														

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:1321432 9766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:1044958863
7

Assinado de forma digital por
EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.08.14 12:56:45
-03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA: 12997073
782

Assinado de forma digital por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA: 12997073782
Data: 2025.08.14 12:57:17
-03'00

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.08.12
13:21:19 -0300

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 Objeto do Contrato: Local da Obra: ORDEN DE SERVIÇO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ORÇAMENTAIS UTILIZADOS DELA. BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG 002/ARP-166-2025 Empresa: ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025 Data de Emissão: 06-08-2025 CNPJ: 17.947.581.0001-76 BOLETIM Nº: BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)			
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000 OBSERVAÇÕES:  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000 OBSERVAÇÕES:  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000 OBSERVAÇÕES:  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000  Quadra de Inconfidência 18/07/2025 16:23 21.13007-45.34863 P. José Rodrigues De Oliveira, 160 - Inconfidência I - MG, 38400-000 OBSERVAÇÕES: <tr><td> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG </td><td> VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 13:21:47 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA </td></tr>		LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 13:21:47 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG Assinado digitalmente por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Assinado digitalmente por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 588637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 13:21:47 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782 ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PERMANENTES UTILIZADOS DEBEM SER:

Data de Emissão: 06/08/2025

Local da Obra:

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ: 17.947.581.0001-76

ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166-2025

BM-02 (OS 002) QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13
214329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355/MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449
588637
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.08.12 13:21:59 -0300
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Assinado digitalmente por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.08.14 13:03:15 -0300
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão:

06-08-2025

Local da Obra:

BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

002/ARP-166-2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ:

17.947.581/0001-76

BOLETIM N°:

BM-02 (OS 002)

QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355/MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.08.14 13:00:25 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.08.12 13:22:18 -03'00'
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970 73782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.08.14 13:03:45 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO							
Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OBJETIVAS UTILIZADOS DESTA					Data de Emissão:	06/08/2025
Local da Obra:	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG					CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	002/ARP-166-2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166-2025	BOLETIM N°:	BM-02 OS 002
							QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:

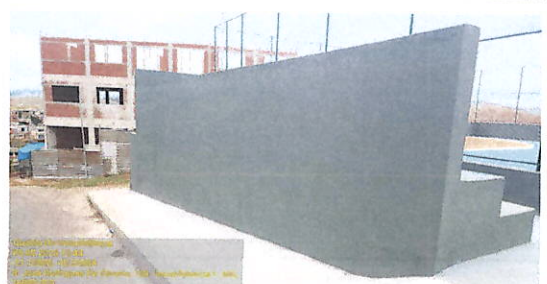

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13 214329766

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355/MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:104495 88637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970 73782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DEBEM				
Objeto do Contrato:	BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG			
Local da Obra:	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025			
ORDEN DE SERVIÇO:	002/ARP-166-2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 17.947.581/0001-76
				BOLETIM Nº: BM-02 (OS 002)
				QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355/MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA
