



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 12/6/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Iluminação da academia de saúde de Boa Família, Iluminação da ponte do bairro Dorcelas, Extensão de rede do Horto Florestal, Extensão de rede em Pirapanema, Iluminação Via Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 21/05/2024 - 10/06/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

R\$ 60.251,84

BM - Número: 4

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 391.396,70

| Item   | Descrição   | Previsto no Orçamento |          |                   |                   | Executado acumulado até este BM |         |                |        | Executado no Período |               |         | Executado acumulado inclusive este BM |             |         | Serviços a executar |  |
|--------|---|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------|---------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------|---------------------|--|
|        |   | Unid.                 | Quant.   | Preço Unit. (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.  | Total (R\$)    | %      | Quant.               | Total (R\$)   | %       | Quant.                                | Total (R\$) | Quant.  | Total (R\$)         |  |
| 1.1.1  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x70-70 | MT                    | 500,00   | 133,62            | R\$ 66.810,00     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 500,00  | 66810,00            |  |
| 1.1.2  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x16-16 | MT                    | 1.500,00 | 64,88             | R\$ 97.320,00     | 100,00%                         | 1500,00 | R\$ 97.320,00  | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 100,00% | 1500,00                               | 97320,00    | 0,00    | 0,00                |  |
| 1.1.3  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3X1X35+35 | MT                    | 3.000,00 | 100,83            | R\$ 302.490,00    | 17,00%                          | 523,34  | R\$ 52.768,37  | 10,00% | 291,00               | R\$ 29.341,53 | 27,00%  | 814,34                                | 82109,90    | 2185,66 | 220380,10           |  |
| 1.1.4  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN                                | PC                    | 3,00     | 1.107,30          | R\$ 3.321,90      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 3,00    | 3321,90             |  |
| 1.1.5  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-300-DAN                                   | PC                    | 35,00    | 1.548,41          | R\$ 54.194,35     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 14,00% | 5,00                 | R\$ 7.742,05  | 14,00%  | 5,00                                  | 7742,05     | 30,00   | 46452,30            |  |
| 1.1.6  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-600-DAN                                   | PC                    | 15,00    | 1.744,91          | R\$ 26.173,65     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 15,00   | 26173,65            |  |
| 1.1.7  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-300-DAN                                   | PC                    | 22,00    | 1.574,12          | R\$ 34.630,64     | 32,00%                          | 7,00    | R\$ 11.018,84  | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 32,00%  | 7,00                                  | 11018,84    | 15,00   | 23611,80            |  |
| 1.1.8  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-600-DAN                                   | PC                    | 12,00    | 1.934,58          | R\$ 23.214,96     | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 12,00   | 23214,96            |  |
| 1.1.9  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-1000-DAN                                  | UN                    | 1,00     | 2.673,15          | R\$ 2.673,15      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 1,00    | 2673,15             |  |
| 1.1.10 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-600-DAN                                   | UN                    | 2,00     | 2.304,83          | R\$ 4.609,66      | 100,00%                         | 2,00    | R\$ 4.609,66   | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 100,00% | 2,00                                  | 4609,66     | 0,00    | 0,00                |  |
| 1.1.11 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS               | UN                    | 100,00   | 1.520,99          | R\$ 152.099,00    | 79,00%                          | 79,00   | R\$ 120.158,21 | 10,00% | 10,00                | R\$ 15.209,90 | 89,00%  | 89,00                                 | 135368,11   | 11,00   | 16730,89            |  |
| 1.1.12 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA                             | UN                    | 12,00    | 447,21            | R\$ 5.366,52      | 100,00%                         | 12,00   | R\$ 5.366,52   | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 100,00% | 12,00                                 | 5366,52     | 0,00    | 0,00                |  |
| 1.1.13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEJ1 - TRIFÁSICA                            | UN                    | 6,00     | 904,81            | R\$ 5.428,86      | 50,00%                          | 3,00    | R\$ 2.714,43   | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 50,00%  | 3,00                                  | 2714,43     | 3,00    | 2714,43             |  |
| 1.1.14 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA                             | UN                    | 12,00    | 754,34            | R\$ 9.052,08      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 25,00% | 3,00                 | R\$ 2.263,02  | 25,00%  | 3,00                                  | 2263,02     | 9,00    | 6789,06             |  |
| 1.1.15 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEJ2 - TRIFÁSICA                            | UN                    | 6,00     | 1.088,59          | R\$ 6.531,54      | 0,00%                           | 0,00    | R\$ 0,00       | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00      | 0,00%   | 0,00                                  | 0,00        | 6,00    | 6531,54             |  |



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 12/6/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Iluminação da academia de saúde de Bos Família, Iluminação da ponte do bairro Dornelas, Extensão de rede do Horto Florestal, Extensão de rede em Pirapanema, Iluminação Via Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 21/05/2024 - 10/06/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

R\$ 60.251,84

BM - Número: 4

Valor Total Inicial do Contrato:

R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

R\$ 391.396,70

| Item   | Descrição  | Previsto no Orçamento |          |                   |                   | Executado acumulado até este BM |        |             | Executado no Período |        |             | Executado acumulado inclusive este BM |        |             | Serviços a executar |             |
|--------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-------------|
|        |  | Unid.                 | Quant.   | Preço Unit. (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$) | %                    | Quant. | Total (R\$) | %                                     | Quant. | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) |
| 1.1.16 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA                                      | UN                    | 12,00    | 1.036,90          | RS 12.442,80      | 25,00%                          | 3,00   | RS 3.110,70 | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 25,00%                                | 3,00   | 3110,70     | 9,00                | 9332,10     |
| 1.1.17 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEN3 - TRIFÁSICA                                     | UN                    | 6,00     | 1.259,38          | RS 7.556,28       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 7556,28     |
| 1.1.18 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFÁSICA                                  | UN                    | 6,00     | 1.477,47          | RS 8.864,82       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 8864,82     |
| 1.1.19 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA                                      | UN                    | 12,00    | 1.284,08          | RS 15.408,96      | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 12,00               | 15408,96    |
| 1.1.20 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEM4 - TRIFÁSICA                                     | UN                    | 6,00     | 1.454,59          | RS 8.727,54       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 8727,54     |
| 1.1.21 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFÁSICA                                       | UN                    | 6,00     | 879,17            | RS 5.275,02       | 50,00%                          | 3,00   | RS 2.637,51 | 50,00%               | 3,00   | RS 2.637,51 | 100,00%                               | 6,00   | 5275,02     | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.22 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFÁSICA                                       | UN                    | 6,00     | 1.319,86          | RS 7.919,16       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 7919,16     |
| 1.1.23 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S11  | UN                    | 10,00    | 278,17            | RS 2.781,70       | 80,00%                          | 8,00   | RS 2.225,36 | 20,00%               | 2,00   | RS 556,34   | 100,00%                               | 10,00  | 2781,70     | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.24 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S12  | UN                    | 10,00    | 304,03            | RS 3.040,30       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 30,00%               | 3,00   | RS 912,09   | 30,00%                                | 3,00   | 912,09      | 7,00                | 2128,21     |
| 1.1.25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S13  | UN                    | 5,00     | 345,46            | RS 1.727,30       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 5,00                | 1727,30     |
| 1.1.26 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFÁSICA                                       | UN                    | 6,00     | 714,97            | RS 4.289,82       | 100,00%                         | 6,00   | RS 4.289,82 | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 100,00%                               | 6,00   | 4289,82     | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.27 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFÁSICA                                       | UN                    | 6,00     | 1.086,10          | RS 6.516,60       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 6516,60     |
| 1.1.28 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFÁSICA CABO PROTEGIDO 50MM | UN                    | 1.000,00 | 236,86            | RS 236.860,00     | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 1000,00             | 236860,00   |
| 1.1.29 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO                              | UN                    | 5,00     | 234,49            | RS 1.172,45       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 5,00                | 1172,45     |
| 1.1.30 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO                               | UN                    | 5,00     | 241,18            | RS 1.205,90       | 40,00%                          | 2,00   | RS 482,36   | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 40,00%                                | 2,00   | 482,36      | 3,00                | 723,54      |
| 1.1.31 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM                       | UN                    | 6,00     | 695,88            | RS 4.175,28       | 0,00%                           | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                | 0,00   | RS 0,00     | 0,00%                                 | 0,00   | 0,00        | 6,00                | 4175,28     |



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 12/6/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Iluminação da academia de saúde de Boa Família, Iluminação da ponte do bairro Dorneias, Extensão de rede do Horto Florestal, Extensão de rede em Pirapanema, Iluminação Via Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 21/05/2024 - 10/06/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Início da Obra: 21/05/2024

BM - Número: 4

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 60.251,84

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 391.396,70

| Item   | Descrição   | Previsto no Orçamento |        |                   |                   | Executado acumulado até este BM |        |              |        | Executado no Período |              |         |        | Executado acumulado inclusive este BM |       |          |             | Serviços a executar |  |
|--------|---|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------|--------------|---------|--------|---------------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------|--|
|        |   | Unid.                 | Quant. | Preço Unit. (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)  | %      | Quant.               | Total (R\$)  | %       | Quant. | Total (R\$)                           | %     | Quant.   | Total (R\$) |                     |  |
| 1.1.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA            | UN                    | 3,00   | 427,31            | R\$ 1.281,93      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 3,00        | 1281,93             |  |
| 1.1.33 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA             | UN                    | 3,00   | 543,64            | R\$ 1.630,92      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 3,00        | 1630,92             |  |
| 1.1.34 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO RDP - CABO 70 MM                          | UN                    | 5,00   | 528,74            | R\$ 2.643,70      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 5,00        | 2643,70             |  |
| 1.1.35 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL   | UN                    | 9,00   | 496,52            | R\$ 4.468,68      | 33,00%                          | 3,00   | R\$ 1.489,56 | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 33,00%  | 3,00   | 1489,56                               | 6,00  | 2979,12  | 6,00        | 2979,12             |  |
| 1.1.36 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA                      | UN                    | 1,00   | 8.030,18          | R\$ 8.030,18      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 1,00        | 8030,18             |  |
| 1.1.37 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA                       | UN                    | 1,00   | 13.877,60         | R\$ 13.877,60     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 1,00        | 13877,60            |  |
| 1.1.38 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA                       | UN                    | 1,00   | 19.071,88         | R\$ 19.071,88     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 1,00        | 19071,88            |  |
| 1.1.39 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA                    | UN                    | 4,00   | 24.823,85         | R\$ 99.295,40     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 4,00        | 99295,40            |  |
| 1.1.40 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA                      | UN                    | 1,00   | 32.063,32         | R\$ 32.063,32     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 1,00        | 32063,32            |  |
| 1.1.41 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA                      | UN                    | 1,00   | 52.097,43         | R\$ 52.097,43     | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 1,00        | 52097,43            |  |
| 1.1.42 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE BAIXA TENSÃO                               | UN                    | 6,00   | 529,80            | R\$ 3.178,80      | 50,00%                          | 3,00   | R\$ 1.589,40 | 50,00% | 3,00                 | R\$ 1.589,40 | 100,00% | 6,00   | 3178,80                               | 0,00  | 0,00     | 0,00        | 0,00                |  |
| 1.1.43 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE MÉDIA TENSÃO                               | UN                    | 3,00   | 828,39            | R\$ 2.485,17      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00     | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,00%   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00     | 3,00        | 2485,17             |  |
| 1.1.44 | ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO  | US                    | 100,00 | 428,01            | R\$ 42.801,00     | 22,00%                          | 22,00  | R\$ 9.416,22 | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 22,00%  | 22,00  | 9416,22                               | 78,00 | 33384,78 | 78,00       | 33384,78            |  |
| 1.1.45 | ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA   | US                    | 100,00 | 276,54            | R\$ 27.654,00     | 8,00%                           | 8,00   | R\$ 2.212,32 | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 8,00%   | 8,00   | 2212,32                               | 92,00 | 25441,68 | 92,00       | 25441,68            |  |
| 1.1.46 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC | UN                    | 5,00   | 9.735,58          | R\$ 48.677,90     | 20,00%                          | 1,00   | R\$ 9.735,58 | 0,00%  | 0,00                 | R\$ 0,00     | 20,00%  | 1,00   | 9735,58                               | 4,00  | 38942,32 | 4,00        | 38942,32            |  |



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 12/6/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Iluminação da academia de saúde de Boa Família, Iluminação da ponte do bairro Dorcas, Extensão de rede do Horto Florestal, Extensão de rede em Pirapanema, Iluminação Via Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 21/05/2024 - 10/06/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Início da Obra: 21/05/2024

BM - Número: 4

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

R\$ 60.251,84

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 391.396,70

| Item          | Descrição   | Previsto no Orçamento |        |                         |                   | Executado acumulado até este BM |                       |             | Executado no Período |                      |             | Executado acumulado inclusive este BM |                       |             | Serviços a executar |                         |
|---------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
|               |   | Unid.                 | Quant. | Preço Unit. (R\$)       | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.                | Total (R\$) | %                    | Quant.               | Total (R\$) | %                                     | Quant.                | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$)             |
| 1.1.47        | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC | UN                    | 4,00   | 14.464,30               | R\$ 57.857,20     | 0,00%                           | 0,00                  | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00                 | R\$ 0,00    | 0,00%                                 | 0,00                  | 0,00        | 4,00                | 57857,20                |
| 1.1.48        | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC | UN                    | 3,00   | 20.333,20               | R\$ 60.999,60     | 0,00%                           | 0,00                  | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00                 | R\$ 0,00    | 0,00%                                 | 0,00                  | 0,00        | 3,00                | 60999,60                |
| <b>TOTAIS</b> |   |                       |        | <b>R\$ 1.599.994,95</b> |                   |                                 | <b>R\$ 331.144,86</b> |             |                      | <b>R\$ 60.251,84</b> |             |                                       | <b>R\$ 391.396,70</b> |             |                     | <b>R\$ 1.208.598,25</b> |

Representante legal do município  
Nome: Jorge Feres Filho  
Cargo: Secretário de Obras Públicas

NADINE MARTINS  
MAGALHÃES  
11216081645

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Nadine Martins Magalhães  
CREA Nº: CREA RJ 2019101128/D

ELETRICA PADRAO DE MURIAE  
LTDA:12759763000108

Responsável pela empresa contratada  
Nome: Lindolfo Alves Dias  
CPF: 722.642.766-49



Assinado de forma digital por ELETRICA  
PADRAO DE MURIAE LTDA:12759763000108  
Dados: 2024.06.15 08:29:06 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|   |   |                               |                                       |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | <b>EXTENSÃO DE REDE</b>                   | Empresa Contratada:           | <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b> |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RUA JOVENATA VEIGA - BOA FAMILIA - MURIAÉ | CNPJ:                         | 12.759.763/0001-08                    |
| <b>Pregão : 250/2023</b>                | <b>Editais: 297/2023</b>                  | Data:                         | 21/5/2024                             |
|   |   | ORDEM DE SERVIÇO: PÇ ACADEMIA |                                       |

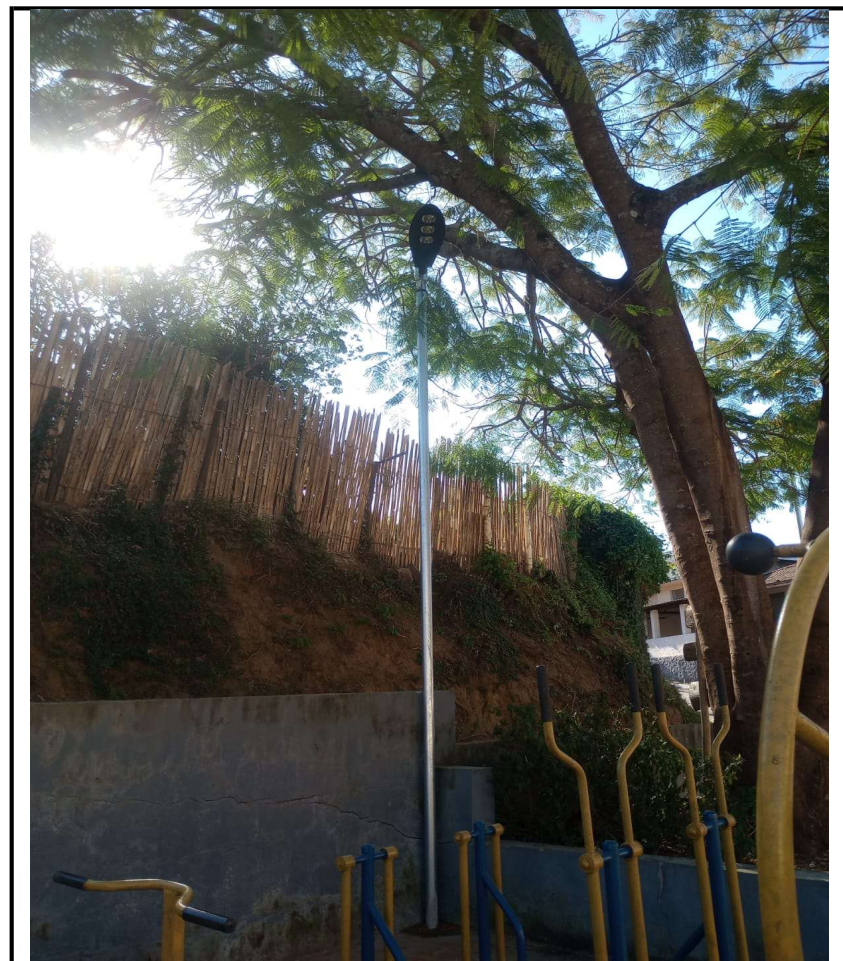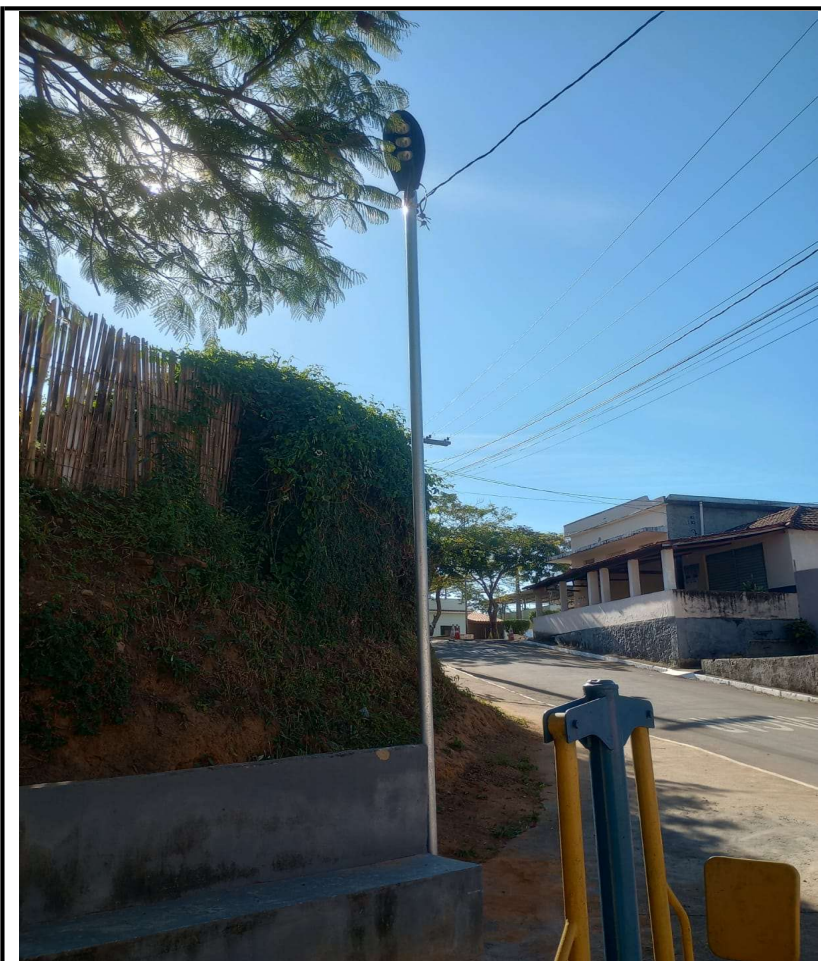



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|   |  |                              |                                       |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | <b>EXTENSÃO DE REDE</b>                        | Empresa Contratada:          | <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b> |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RUA VEREADOR JACI VARGAS - PIRAPANEMA - MURIAÉ | CNPJ:                        | 12.759.763/0001-08                    |
| <b>Pregão : 250/2023</b>                | <b>Editais: 297/2023</b>                       | Data:                        | 27/5/2024                             |
|   |  | ORDEM DE SERVIÇO: PIRAPANEMA |                                       |



27 de mai de 2024 13:03:57  
582 Rua Vereador Jaci Vargas  
Pirapanema  
Muriaé  
Minas Gerais



27 de mai de 2024 13:02:22  
1722 Rua Vereador Jaci Vargas  
Pirapanema  
Muriaé  
Minas Gerais



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|   |  |                              |                                       |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | <b>EXTENSÃO DE REDE</b>                        | Empresa Contratada:          | <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b> |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RUA VEREADOR JACI VARGAS - PIRAPANEMA - MURIAÉ | CNPJ:                        | 12.759.763/0001-08                    |
| <b>Pregão : 250/2023</b>                | <b>Edital: 297/2023</b>                        | Data:                        | 28/5/2024                             |
|   |  | ORDEM DE SERVIÇO: PIRAPANEMA |                                       |







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|   |                          |                             |                                       |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | <b>EXTENSÃO DE REDE</b>  | Empresa Contratada:         | <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b> |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RODOVIA BR 356 - MURIAÉ  | CNPJ:                       | 12.759.763/0001-08                    |
| <b>Pregão : 250/2023</b>                | <b>Editais: 297/2023</b> | Data:                       | 29/5/2024                             |
|   |                          | ORDEM DE SERVIÇO: VIA SAÚDE |                                       |

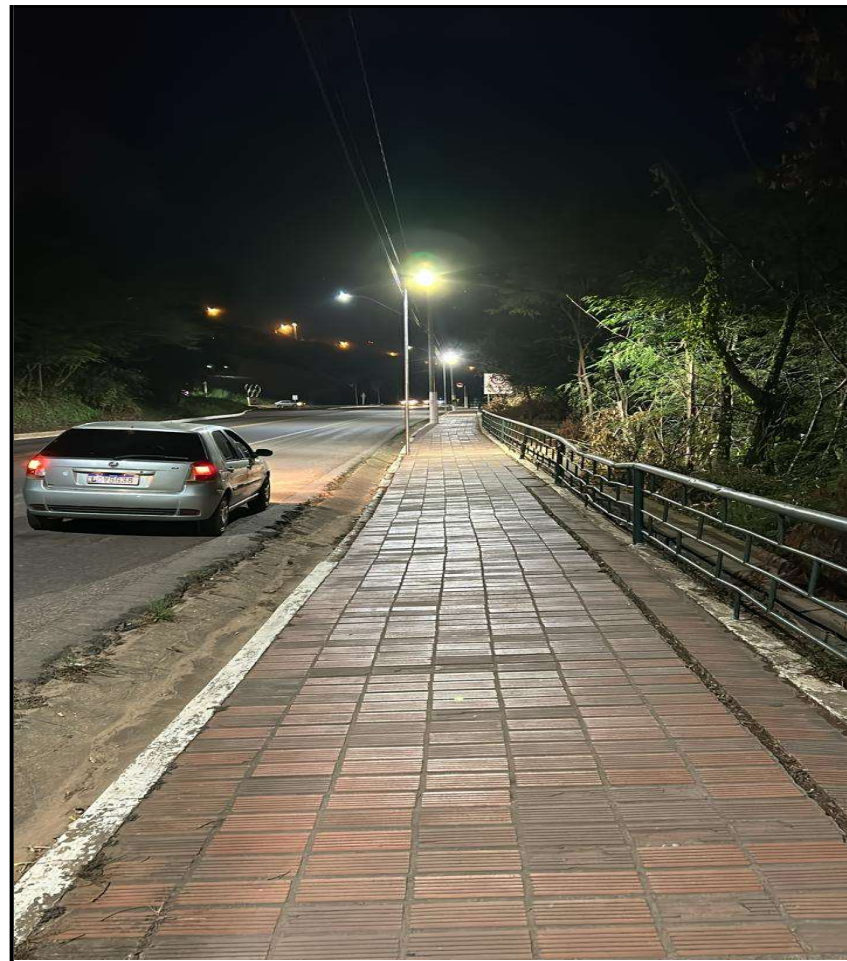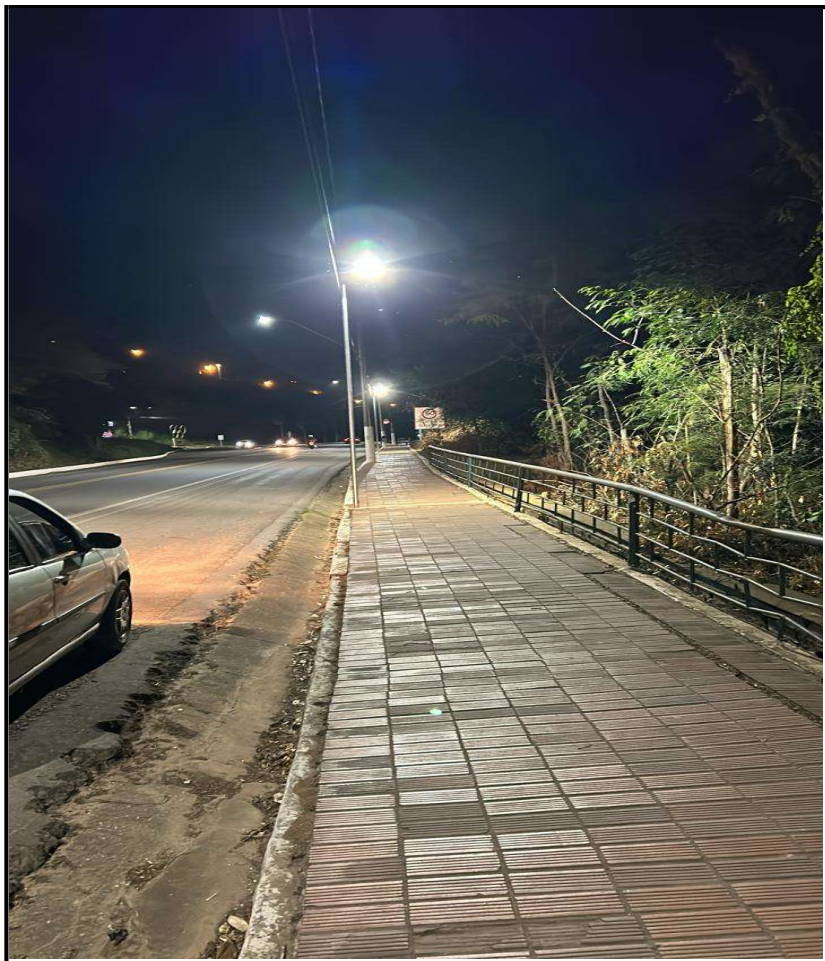







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|  |                  |   |                                  |
|--|------------------|---|----------------------------------|
| Objeto do Contrato: <b>EXTENSÃO DE REDE</b>                        |                  | Empresa Contratada: <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b> |                                  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):<br>RODOVIA BR 356 - MURIAÉ |                  | CNPJ: 12.759.763/0001-08                                  | ORDEM DE SERVIÇO: PONTE DORNELAS |
| Pregão : 250/2023  | Edital: 297/2023 | Data: 3/6/2024  |                                  |

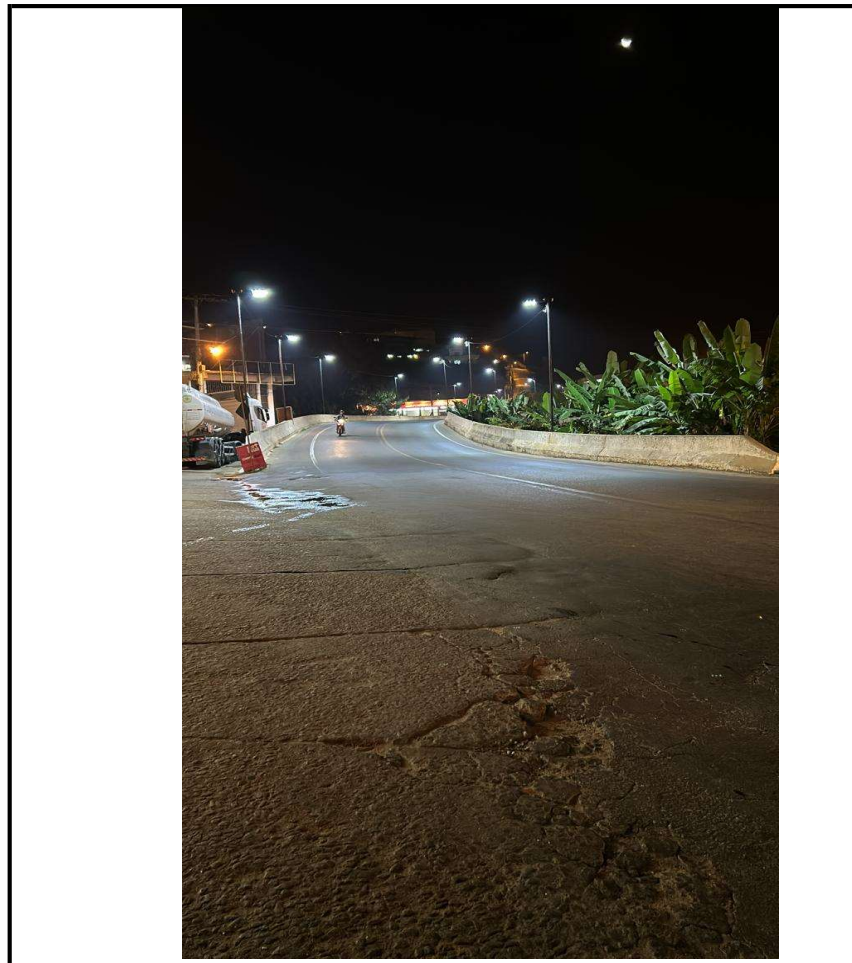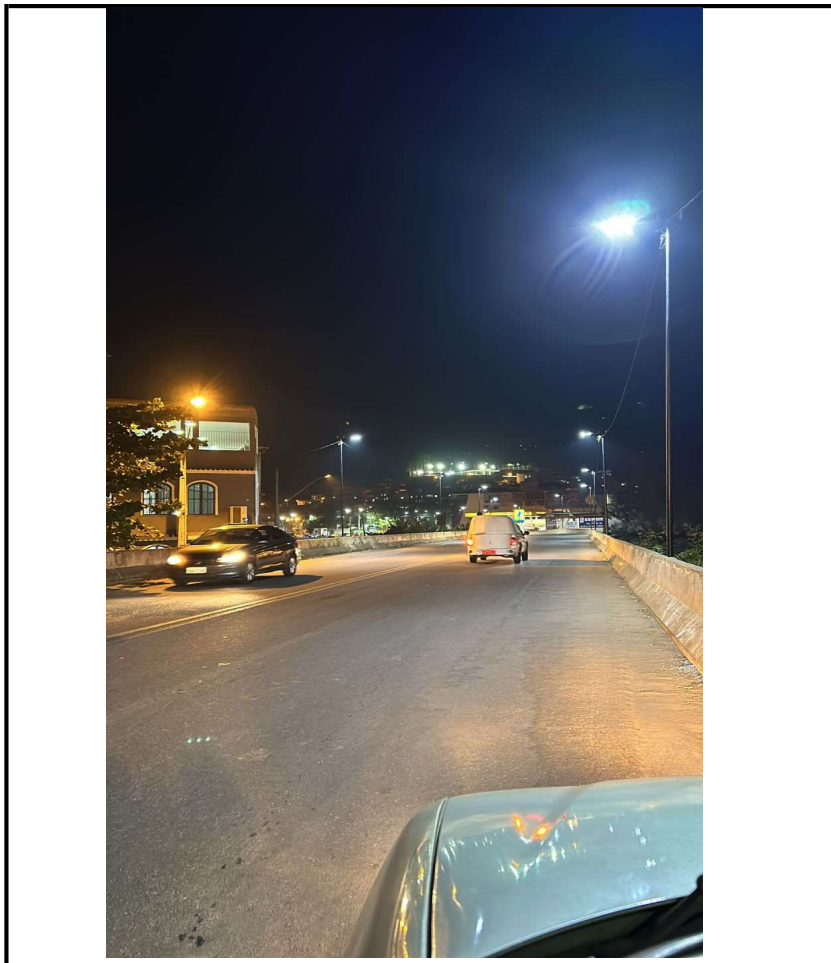



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
**HORTO FLORESTAL - GAVEA - MURIAÉ**



CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: HORTO FLORESTAL

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 7/6/2024

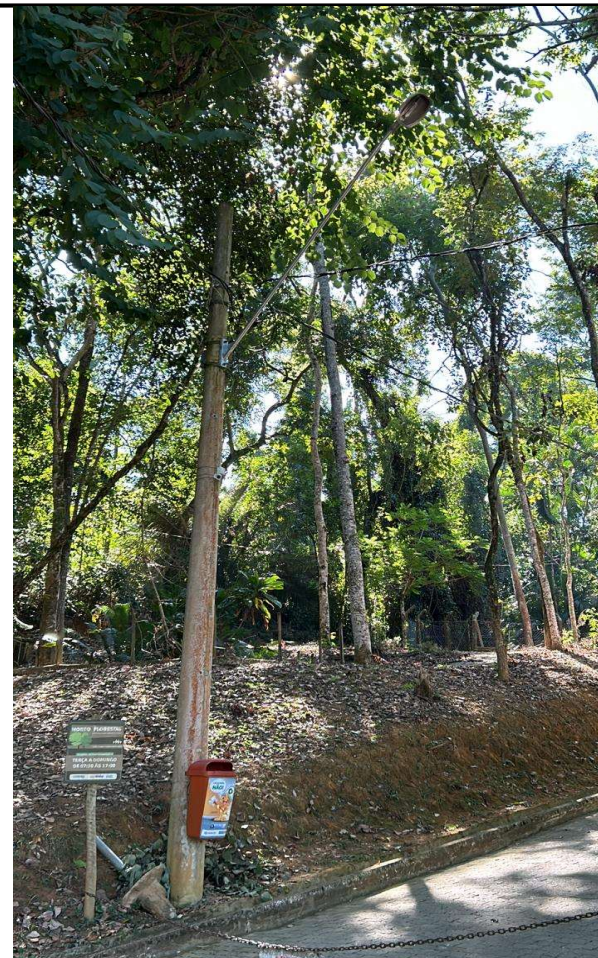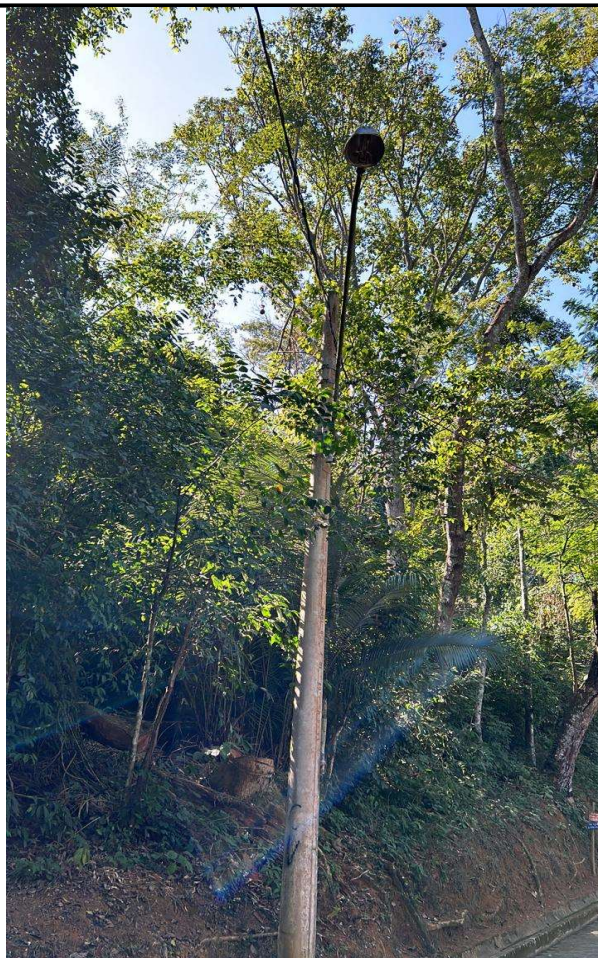



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
**HORTO FLORESTAL - GAVEA - MURIAÉ**

CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: HORTO FLORESTAL

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 10/6/2024

