



Como colocar o MacDrain®

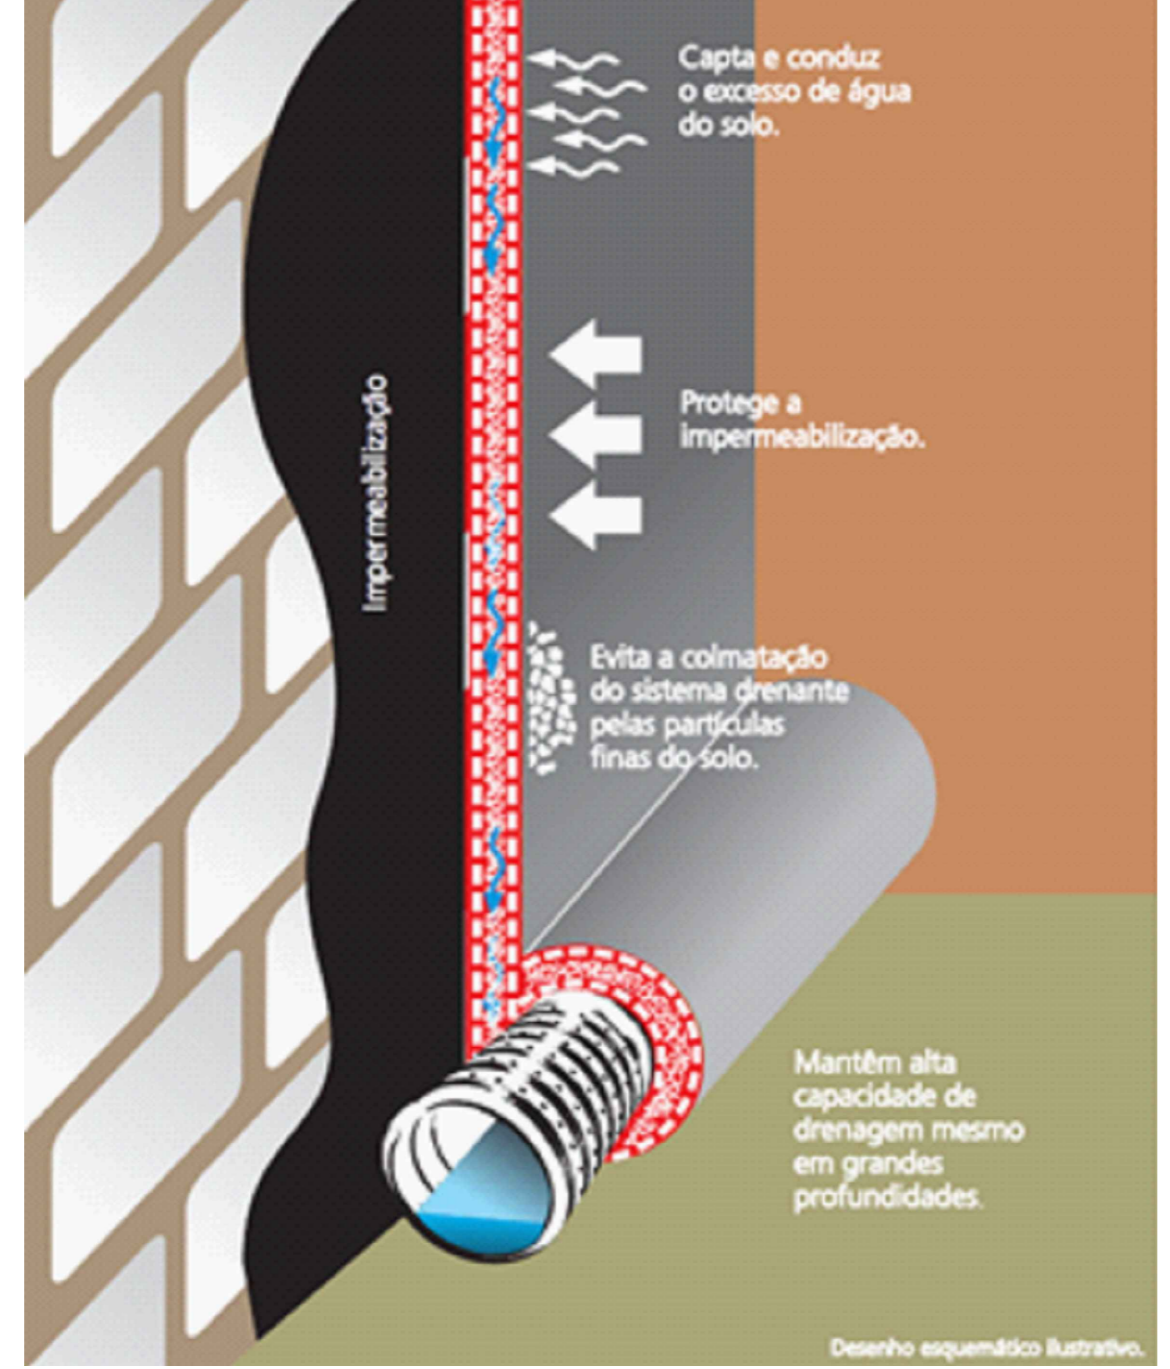


MODELO E MEDIDAS QUE PODEM SER UTILIZADO NESSE PROJETO:

TIPO	LARGURA (m)	COMPR. (m)	DIÂMETRO MÉDIO (m)	PESO (kg)
MacDrain® 2L FP	1	10	0,40	7
	2	30	0,70	42

- LEGENDA:**
- MacDrain® 2L FP = TOTAL GERAL: 471,00 M2
 - TUBO CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN100 = TOTAL GERAL: 120,00 METROS
 - TUBO PVC DN100 = TOTAL GERAL: 146,52 METROS
 - CAIXA DE PASSAGEM: 50X60X70: 02 UNIDADES

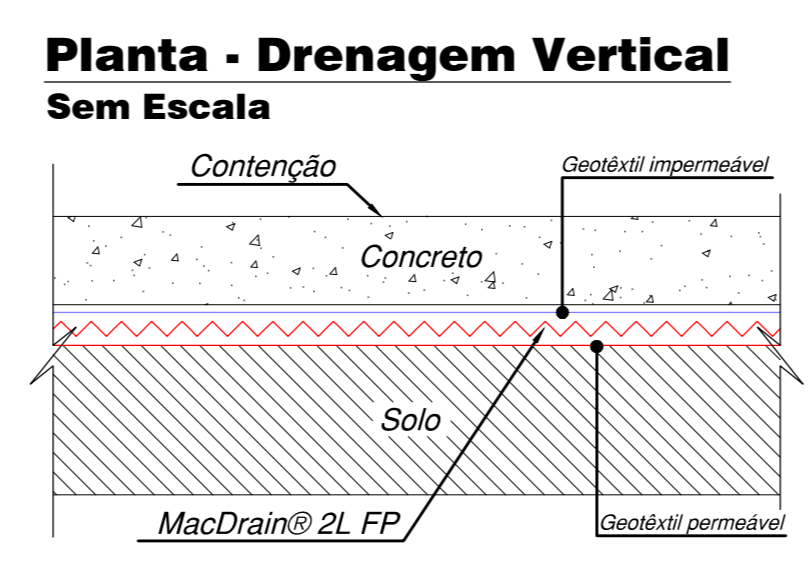

Detalhe ilustrativo MacDrain® 2L FP Sem Escala

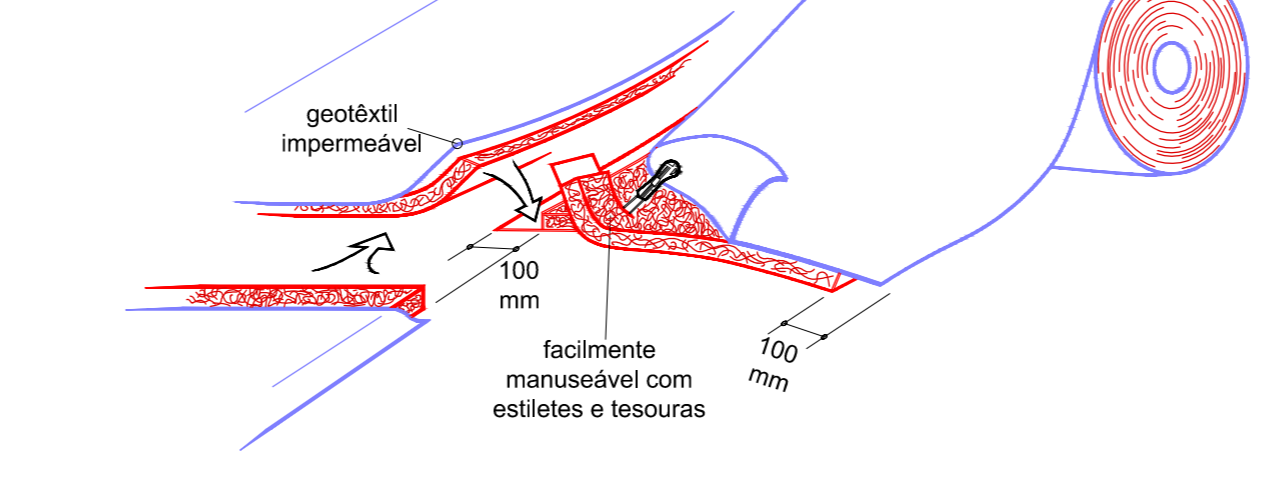

- SEQUÊNCIA EXECUTIVA DA DRENEGEM DOS MUIROS:**
- 1ª A MEDIDA QUE O MURO FOR SENDO LEVANTADO DEVERÁ SER EXECUTADO OS BARBACÁS CONFORME O DETALHAMENTO;
 - 2ª DEVERÁ SER EXECUTADO A CAMADA DE BRITA QUE IRÁ ABAIXO DO TUBO CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN100, VERIFICANDO ENTÃO AS COTAS NECESSÁRIAS MENCIONADAS EM PROJETO, EM TODA SUA EXTENSÃO ATÉ CHEGAR NOS LOCAIS DE LANÇAMENTO, PARA QUE TENHA O REAL ESCOAMENTO DA ÁGUA;
 - 3ª DEVERÁ SER EXECUTADO A LOCAÇÃO DO TUBO CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN100 ENVOLTO NA MACDRAIN ACIMA DO COLÇÃO DE BRITA, VERIFICANDO NOVAMENTE SUAS ALTURAS PARA DECLIVIDADE NECESSÁRIA ATÉ O LANÇAMENTO, LEMBRANDO QUE A MACDRAIN ENVOLTA NO TUBO TAMBÉM VAI NA FACE DO MURO;
 - 4ª EXECUTAR A CAMADA DE BRITA ACIMA DO TUBO DRENO JÁ ENVOLTO NA MACDRAIN, FECHANDO ENTÃO A CAIXA DE DRENO BRITA;
 - 5ª DEVERÁ SER COLOCADO A MANTA MACDRAIN FP DESDE A PARTE SUPERIOR DO MURO;
 - 6ª FINALIZANDO A EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO, DEVERÁ SER LANÇADO O REATERRO EM MATERIA DE 1ª CATEGORIA, DEVIDAMENTE COMPACTADO;
 - 7ª APÓS A EXECUÇÃO DO MURO, DEVERÁ SER EXECUTADO A DRENEGEM DE CRISTA CONFORME DETALHES E SEUS DEVIDOS LANÇAMENTOS.
- TODA ETAPA DE EXECUÇÃO É NECESSÁRIA PARA UM TOTAL FUNCIONAMENTO DA DRENEGEM DOS MUIROS, GARANTINDO ASSIM SUA TOTAL SEGURANÇA E INTEGRIDADE.

NOTAS:

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES								
T.E.	(A) PRELIMINAR	(B) PARA COTAÇÃO	(C) CONFORME CONSTRUÍDO					
TIPO DE EMISSÃO	(1) PARA APROVAÇÃO	(2) PARA CONSTRUÇÃO	(3) CANCELADO					
PROJETA	(4) PARA CONHECIMENTO	(5) CONFORME CONHECIMENTO						
APROVAÇÃO	ASSINATURA	DATA						
R1	ASSINATURA	DATA						
PROJETA	ROBERTA SIMONE RODRIGUES DA SILVA	CAU/MG/46014-9	OUTUBRO/2021					
SUPERVISOR	FABÍOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 79.850/D	JAN/2022					

CONEPB PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE DRENEGEM DOS MUIROS

BAIRRO SAFIRA

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA

DETALHES DE DRENEGEM DOS MUIROS DE CONTENÇÃO

PLANTA DE DRENEGEM ATRÁS DOS MUIROS

REVISÃO: 00

DATA: 05-06/2021

FOLHA: 01/02
