



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 2/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): ILUMINAÇÃO PRAÇA CAMPESTRE LELENTE, CALÇADÃO CARDOSO DE MELO, PRAÇA BOA FAMÍLIA, EXTENSÃO DE REDE RUA MANOEL VIEIRA E RUA MARGARIDA BRANDÃO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/03/2024 - 26/04/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Editais: 297/2023

Valor da Medição:

RS 170.174,11

BM - Número: 2

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 262.592,04

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unid. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x70-70	MT	500,00	133,62	RS 66.810,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	66810,00
1.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x16-16	MT	1.500,00	64,88	RS 97.320,00	49,00%	737,58	RS 47.854,19	51,00%	762,42	RS 49.465,81	100,00%	1500,00	97320,00	0,00	0,00
1.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3X1X15-15	MT	3.000,00	100,83	RS 302.490,00	0,00%	0,00	RS 0,00	5,00%	145,34	RS 14.654,63	5,00%	145,34	14654,63	2854,66	287835,37
1.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN	PC	3,00	1.107,30	RS 3.321,90	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	3321,90
1.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-300-DAN	PC	35,00	1.548,41	RS 54.194,35	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	35,00	54194,35
1.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-600-DAN	PC	15,00	1.744,91	RS 26.173,65	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	26173,65
1.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-300-DAN	PC	22,00	1.574,12	RS 34.630,64	0,00%	0,00	RS 0,00	18,00%	4,00	RS 6.296,48	18,00%	4,00	6296,48	18,00	28334,16
1.1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-600-DAN	PC	12,00	1.934,58	RS 23.214,96	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	23214,96
1.1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-1000-DAN	UN	1,00	2.673,15	RS 2.673,15	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2673,15
1.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-600-DAN	UN	2,00	2.304,83	RS 4.609,66	100,00%	2,00	RS 4.609,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	4609,66	0,00	0,00
1.1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS	UN	100,00	1.520,99	RS 152.099,00	22,00%	22,00	RS 33.461,78	50,00%	50,00	RS 76.049,50	72,00%	72,00	109511,28	28,00	42587,72
1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	12,00	447,21	RS 5.366,52	50,00%	6,00	RS 2.683,26	25,00%	3,00	RS 1.341,63	75,00%	9,00	4024,89	3,00	1341,63
1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	904,81	RS 5.428,86	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	5428,86
1.1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	12,00	754,34	RS 9.052,08	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	9052,08
1.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.088,59	RS 6.531,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6531,54



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 2/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): ILUMINAÇÃO PRAÇA CAMPESTRE LELENTE, CALÇADÃO CARDOSO DE MELO, PRAÇA BOA FAMÍLIA, EXTENSÃO DE REDE RUA MANOEL VIEIRA E RUA MARGARIDA BRANDÃO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/03/2024 - 26/04/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Início da Obra: 26/03/2024

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 262.592,04

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
1.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.036,90	RS 12.442,80	0,00%	0,00	RS 0,00	25,00%	3,00	RS 3.110,70	25,00%	3,00	3110,70	9,00	9332,10
1.1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEN3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.259,38	RS 7.556,28	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7556,28
1.1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.477,47	RS 8.864,82	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8864,82
1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.284,08	RS 15.408,96	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	15408,96
1.1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEM4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.454,59	RS 8.727,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8727,54
1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	879,17	RS 5.275,02	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	5275,02
1.1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.319,86	RS 7.919,16	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7919,16
1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI1	UN	10,00	278,17	RS 2.781,70	30,00%	3,00	RS 834,51	30,00%	3,00	RS 834,51	60,00%	6,00	1669,02	4,00	1112,68
1.1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI2	UN	10,00	304,03	RS 3.040,30	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	3040,30
1.1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI3	UN	5,00	345,46	RS 1.727,30	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1727,30
1.1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	714,97	RS 4.289,82	50,00%	3,00	RS 2.144,91	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	3,00	2144,91	3,00	2144,91
1.1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.086,10	RS 6.516,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6516,60
1.1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFÁSICA CABO PROTEGIDO 50MM	UN	1.000,00	236,86	RS 236.860,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1000,00	236860,00
1.1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO	UN	5,00	234,49	RS 1.172,45	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1172,45
1.1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO	UN	5,00	241,18	RS 1.205,90	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1205,90
1.1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABECAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM	UN	6,00	695,88	RS 4.175,28	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	4175,28



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

Local da Obra (Bairro, município e UF): ILUMINAÇÃO PRACA CAMPESTRE LELENTE, CALÇADÃO CARDOSO DE MELO, PRACA BOA FAMÍLIA, EXTENSÃO DE REDE RUA MANOEL VIEIRA E RUA MARGARIDA BRANDÃO,
Muriaé - MG

Pregão: 1250/2023

BM - Data de Emissão: 2/5/2024

BM - Período de Referência da Medição: 26/03/2024 - 26/04/2024

Início da Obra: 26/03/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 262.592,84

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Edital: 297/2023		Valor da Medição: R\$ 170.174,11		BM - Número: 2		Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	Executado acumulado até este BM		Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		Valor Total Medido Acumulado		Valor Total Inicial do Contrato			
						%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
1.1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA	UN	3,00	427,31	RS 1.281,93	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1281,93	
1.1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA	UN	3,00	543,64	RS 1.630,92	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1630,92	
1.1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO RDP - CABO 70 MM	UN	5,00	528,74	RS 2.643,70	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	2643,70	
1.1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	UN	9,00	496,52	RS 4.468,68	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	9,00	4468,68	
1.1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	UN	1,00	8.030,18	RS 8.030,18	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	8030,18	
1.1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	UN	1,00	13.877,60	RS 13.877,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	13877,60	
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UN	1,00	19.071,88	RS 19.071,88	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	19071,88	
1.1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA	UN	4,00	24.823,85	RS 99.295,40	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	99295,40	
1.1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UN	1,00	32.063,32	RS 32.063,32	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	32063,32	
1.1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA	UN	1,00	52.097,43	RS 52.097,43	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	52097,43	
1.1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE BAIXA TENSÃO	UN	6,00	529,80	RS 3.178,80	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	3178,80	
1.1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE MÉDIA TENSÃO	UN	3,00	828,39	RS 2.485,17	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	2485,17	
1.1.44	ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO	US	100,00	428,01	RS 42.801,00	0,00%	0,00	RS 0,00	19,00%	19,00	RS 8.132,19	19,00%	19,00	8132,19	81,00	34668,81	
1.1.45	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA	US	100,00	276,54	RS 27.654,00	3,00%	3,00	RS 829,62	2,00%	2,00	RS 553,08	5,00%	5,00	1382,70	95,00	26271,30	
1.1.46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC	UN	5,00	9.735,58	RS 48.677,90	0,00%	0,00	RS 0,00	20,00%	1,00	RS 9.735,58	20,00%	1,00	9735,58	4,00	38942,32	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

Local da Obra (Bairro, município e UF): ILUMINAÇÃO PRAÇA CAMPESTRE LELENTE, CALÇADÃO CARDOSO DE MELO, PRAÇA BOA FAMÍLIA, EXTENSÃO DE REDE RUA MANOEL VIEIRA E RUA MARGARIDA BRANDÃO.

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

BM - Data de Emissão:

2/5/2024

BM - Período de Referência da Medição: 26/03/2024 - 26/04/2024

Início da Obra: 26/03/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

CNPJ: 12.759.763/0001-08

BM - Número: 2

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 262.592,04

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
1.1.47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC	UN	4,00	14.464,30	RS 57.857,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4,00	57857,20
1.1.48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC	UN	3,00	20.333,20	RS 60.999,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,00	60999,60
TOTAIS				RS 1.599.994,95			RS 92.417,93			RS 170.174,11			RS 262.592,04			RS 1.337.402,91	

Representante legal do município
Nome: Jorge Feres Filho
Cargo: Secretário de Obras Públicas

NADINE MARTINS
MAGALHAES:
11216061645

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Nadine Martins Magalhães
CREA N°: CREA RJ 2019101128/D

ELETRICA PADRAO DE MURIAE
LTDA:12759763000108

Responsável pela empresa contratada
Nome: Lindolfo Alves Dias
CPF: 722.642.766-49

Assinado de forma digital por ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDA:12759763000108
Dados: 2024.05.03 11:24:05 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA DA CACHIERA - ENCOBERTA		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: RUA DA CAHOEIRA
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 26/3/2024	






Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXTENSÃO DE REDE	Empresa Contratada:	Elétrica Padrão de Muriaé Ltda
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA DA CACHIERA - ENCOBERTA	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Editais: 297/2023	Data:	31/3/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: RUA DA CAHOEIRA	


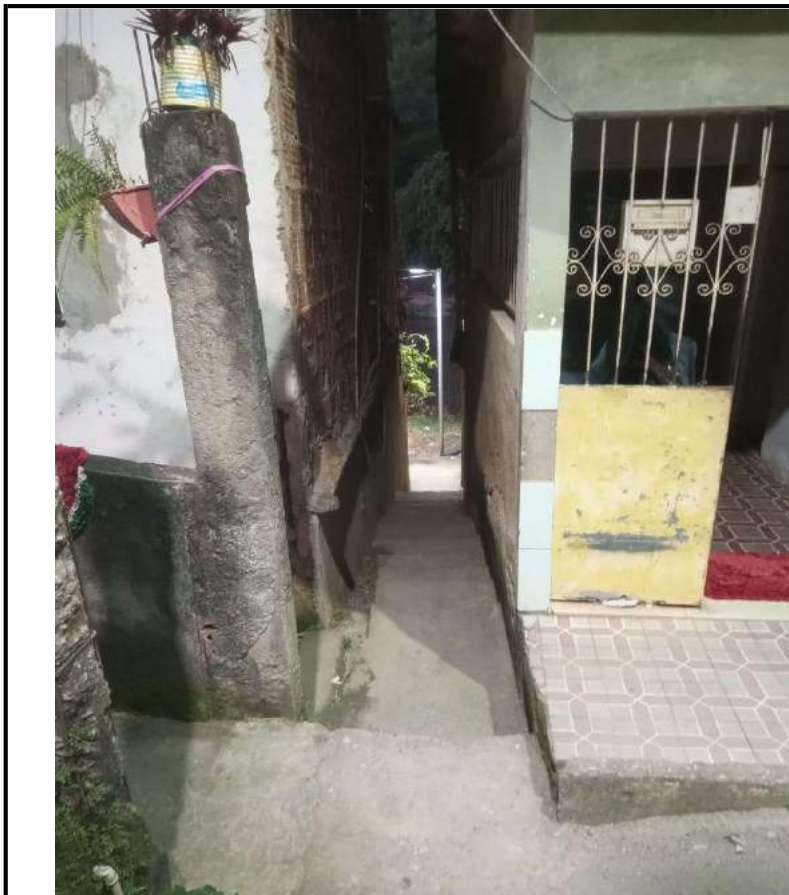




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RODOVIA 356		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: BR 356 SENTIDO AO CARDOSO DE MELO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 1/4/2024	

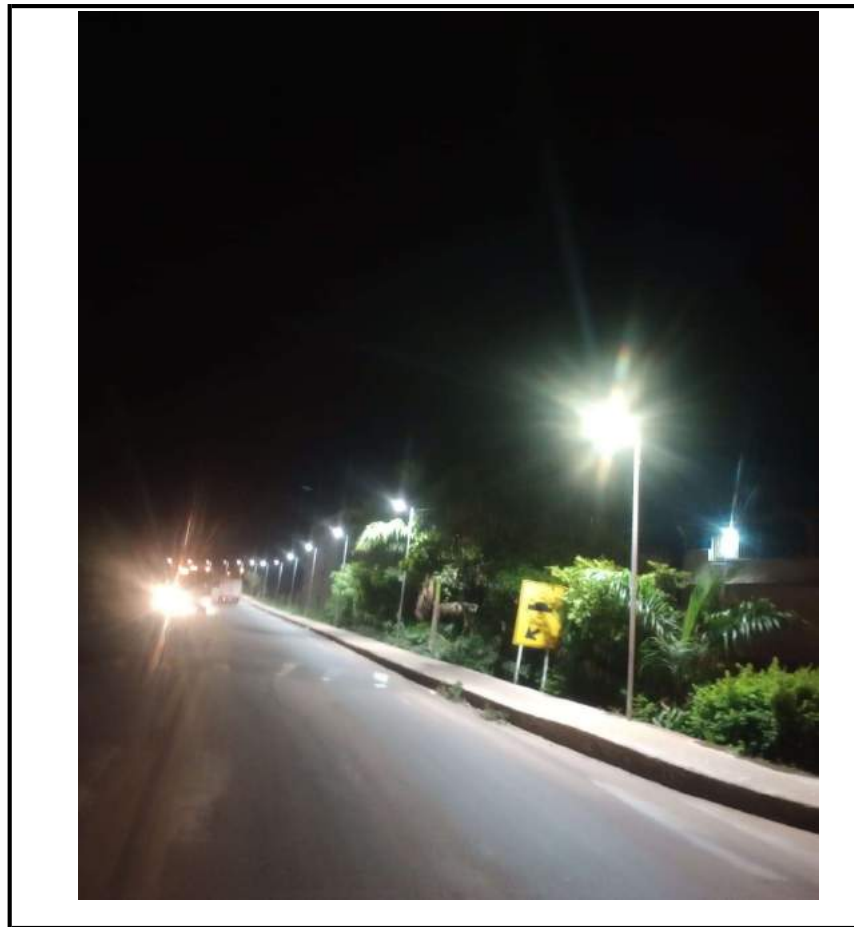
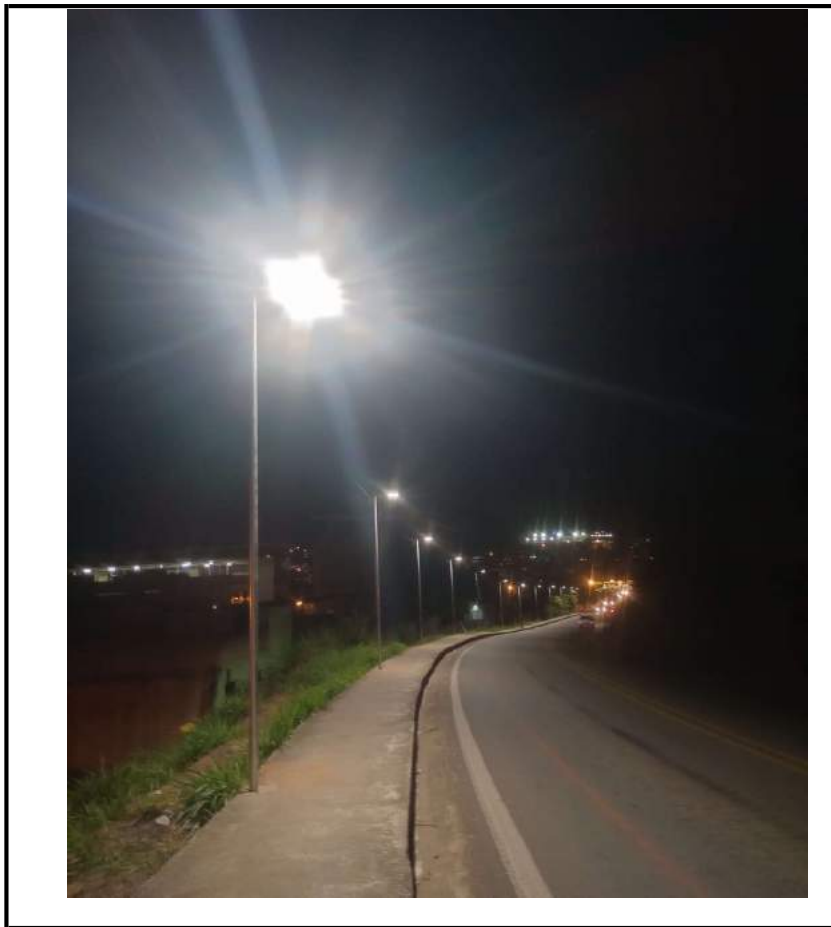




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RODOVIA 356		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: BR 356 SENTIDO AO CARDOSO DE MELO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 8/4/2024	

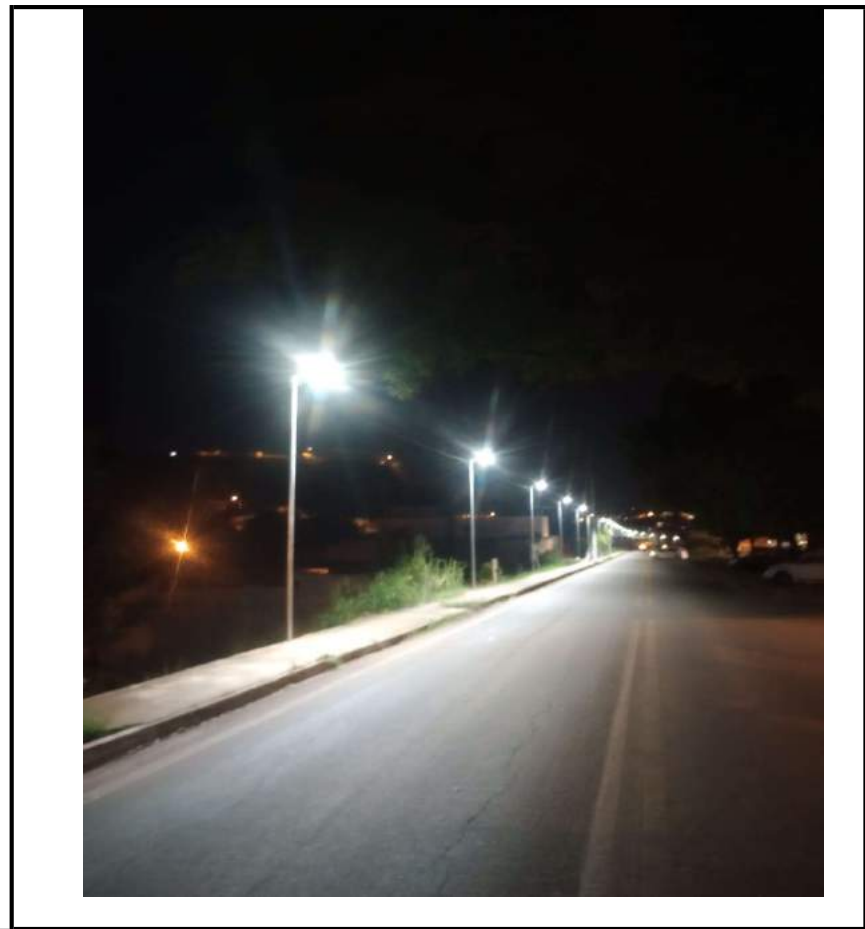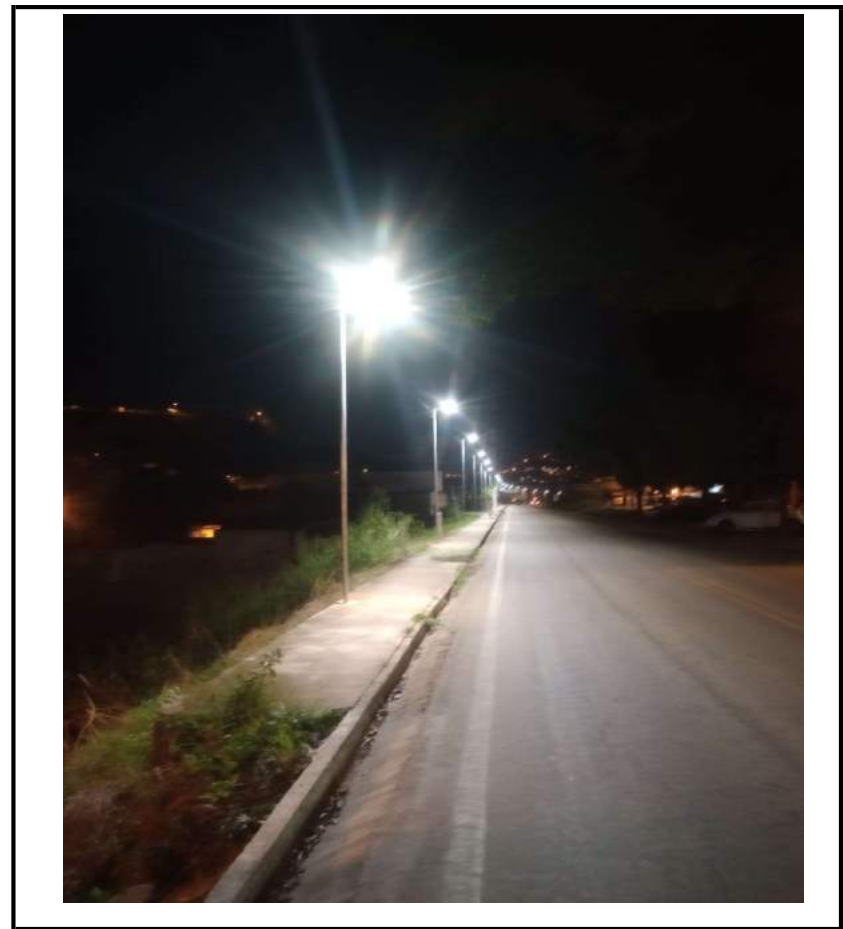



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA DO CAMPO- BOA FAMILIA		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: PÇ BOA FAMILIA
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 9/4/2024	





Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

EXTENSÃO DE REDE

Empresa Contratada:

Elétrica Padrão de Muriaé Ltda

Local da Obra (Bairro, município e UF):

RUA DO CAMPO- BOA FAMILIA

CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: PÇ BOA FAMILIA

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data:

15/4/2024





Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):
RUA MARGARIDA BRANDÃO - SANTO ANTONIO


CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: RUA DO JACARÉ

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 16/4/2024

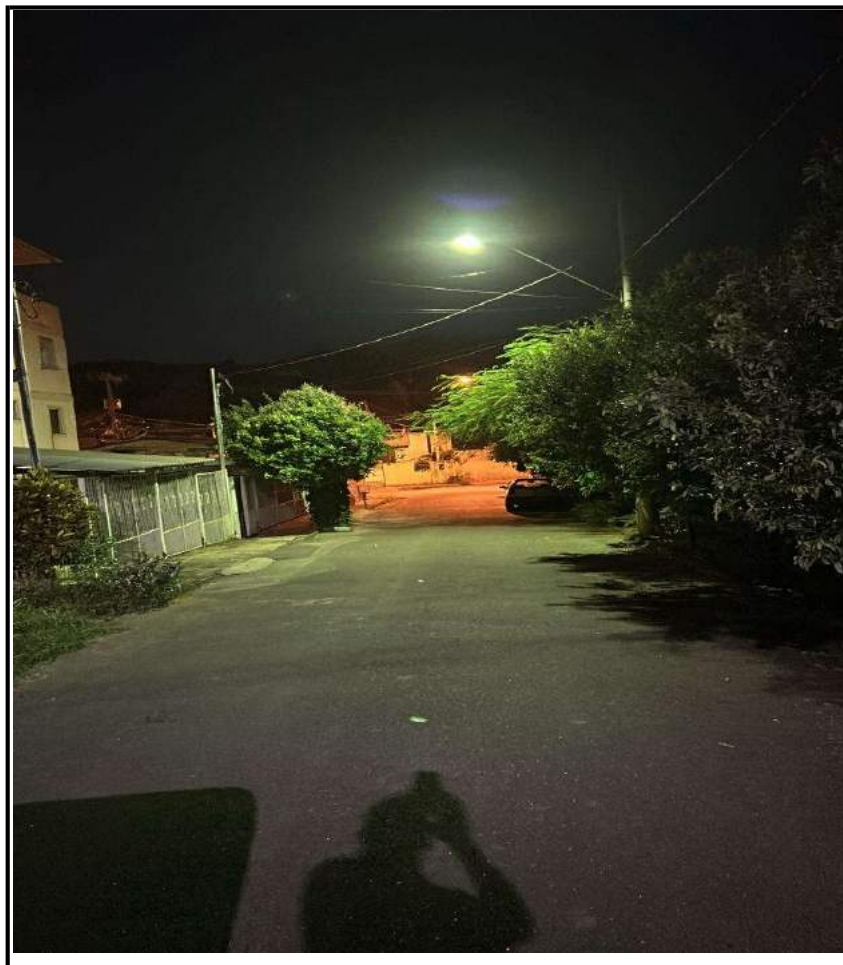



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):
RUA MARGARIDA BRANDÃO - SANTO ANTONIO


CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: RUA DO JACARÉ

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 24/4/2024





Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):
RUA PROJETADA -

CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: CAMPESTRE LELENTE

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 25/4/2024

