



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 19/7/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Rua Cel Francisco Varanilha - Porto, Travessa C e Rua Helen Maria - Marambaia, Rua Manoel Correa do Prado - Aeroporto, Rua Jerusalem - Padre Tiago e Praça Gaspar.

BM - Período de Referência da Medição: 12/06/2024 - 13/07/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Editais: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 85.189,85

BM - Número: 5

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 476.586,55

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
1.1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x70+70	MT	500,00	133,62	RS 66.810,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	66810,00			
1.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x16+16	MT	1.500,00	64,88	RS 97.320,00	100,00%	1500,00	RS 97.320,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1500,00	97320,00	0,00	0,00			
1.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3X1X35+35	MT	3.000,00	100,83	RS 302.490,00	27,00%	814,34	RS 82.109,90	14,00%	422,50	RS 42.600,68	41,00%	1236,84	124710,58	1763,16	177779,42			
1.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN	PC	3,00	1.107,30	RS 3.321,90	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	3321,90			
1.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-300-DAN	PC	35,00	1.548,41	RS 54.194,35	14,00%	5,00	RS 7.742,05	0,00%	0,00	RS 0,00	14,00%	5,00	7742,05	30,00	46452,30			
1.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-600-DAN	PC	15,00	1.744,91	RS 26.173,65	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	26173,65			
1.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-300-DAN	PC	22,00	1.574,12	RS 34.630,64	32,00%	7,00	RS 11.018,84	23,00%	5,00	RS 7.870,60	55,00%	12,00	18889,44	10,00	15741,20			
1.1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-600-DAN	PC	12,00	1.934,58	RS 23.214,96	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	23214,96			
1.1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-1000-DAN	UN	1,00	2.673,15	RS 2.673,15	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2673,15			
1.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-600-DAN	UN	2,00	2.304,83	RS 4.609,66	100,00%	2,00	RS 4.609,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	4609,66	0,00	0,00			
1.1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS	UN	100,00	1.520,99	RS 152.099,00	89,00%	89,00	RS 135.368,11	10,00%	10,00	RS 15.209,90	99,00%	99,00	150578,01	1,00	1520,99			
1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	12,00	447,21	RS 5.366,52	100,00%	12,00	RS 5.366,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	5366,52	0,00	0,00			
1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE11 - TRIFÁSICA	UN	6,00	904,81	RS 5.428,86	50,00%	3,00	RS 2.714,43	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	3,00	2714,43	3,00	2714,43			
1.1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	12,00	754,34	RS 9.052,08	25,00%	3,00	RS 2.263,02	0,00%	0,00	RS 0,00	25,00%	3,00	2263,02	9,00	6789,06			
1.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE12 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.088,59	RS 6.531,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6531,54			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 19/7/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Rua Cel Francisco Vermelho - Porto, Travessa C e Rua Helen Maria - Marambalá, Rua Manoel Correa do Prado - Aeroporto, Rua Jerusalém - Padre Tiago e Praça Gaspar, ...

BM - Período de Referência da Medição: 12/06/2024 - 13/07/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Início da Obra: 12/06/2024

BM -

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Preço: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

R\$ 85.189,85

Número: 5

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 476.586,55

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.036,90	R\$ 12.442,80	25,00%	3,00	R\$ 3.110,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,00%	3,00	3110,70	9,00	9332,10
1.1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEN3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.259,38	R\$ 7.556,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7556,28
1.1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.477,47	R\$ 8.864,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8864,82
1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.284,08	R\$ 15.408,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	6,00	R\$ 7.704,48	50,00%	6,00	7704,48	6,00	7704,48
1.1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEM4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.454,59	R\$ 8.727,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8727,54
1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	879,17	R\$ 5.275,02	100,00%	6,00	R\$ 5.275,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	5275,02	0,00	0,00
1.1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.319,86	R\$ 7.919,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	3,00	R\$ 3.959,58	50,00%	3,00	3959,58	3,00	3959,58
1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S11	UN	10,00	278,17	R\$ 2.781,70	100,00%	10,00	R\$ 2.781,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	10,00	2781,70	0,00	0,00
1.1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S12	UN	10,00	304,03	R\$ 3.040,30	30,00%	3,00	R\$ 912,09	30,00%	3,00	R\$ 912,09	60,00%	6,00	1824,18	4,00	1216,12
1.1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S13	UN	5,00	345,46	R\$ 1.727,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1727,30
1.1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	714,97	R\$ 4.289,82	100,00%	6,00	R\$ 4.289,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	4289,82	0,00	0,00
1.1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.086,10	R\$ 6.516,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	3,00	R\$ 3.258,30	50,00%	3,00	3258,30	3,00	3258,30
1.1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFÁSICA CABO PROTEGIDO 50MM	UN	1.000,00	236,86	R\$ 236.860,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1000,00	236860,00
1.1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO	UN	5,00	234,49	R\$ 1.172,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1172,45
1.1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO	UN	5,00	241,18	R\$ 1.205,90	40,00%	2,00	R\$ 482,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,00%	2,00	482,36	3,00	723,54
1.1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM	UN	6,00	695,88	R\$ 4.175,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	4175,28



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 19/7/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Rua Cel Francisco Vermelho - Porto, Travessa C e Rua Helem Maria - Marambala, Rua Manoel Correa do Prado - Aeroporto, Rua Jerusalem - Padre Tiago e Praça Gaspar,

BM - Período de Referência da Medição: 12/06/2024 - 13/07/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 85.189,85

BM - Número: 5

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 476.586,55

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
1.1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABECAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA	UN	3,00	427,31	R\$ 1.281,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1281,93			
1.1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABECAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA	UN	3,00	543,64	R\$ 1.630,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1630,92			
1.1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABECAMENTO RDP - CABO 70 MM	UN	5,00	528,74	R\$ 2.643,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	2643,70			
1.1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	UN	9,00	496,52	R\$ 4.468,68	33,00%	3,00	R\$ 1.489,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,00%	3,00	1489,56	6,00	2979,12			
1.1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	UN	1,00	8.030,18	R\$ 8.030,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	8030,18			
1.1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	UN	1,00	13.877,60	R\$ 13.877,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	13877,60			
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UN	1,00	19.071,88	R\$ 19.071,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	19071,88			
1.1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA	UN	4,00	24.823,85	R\$ 99.295,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	99295,40			
1.1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UN	1,00	32.063,32	R\$ 32.063,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	32063,32			
1.1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA	UN	1,00	52.097,43	R\$ 52.097,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	52097,43			
1.1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE BAIXA TENSÃO	UN	6,00	529,80	R\$ 3.178,80	100,00%	6,00	R\$ 3.178,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	3178,80	0,00	0,00			
1.1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE MÉDIA TENSÃO	UN	3,00	828,39	R\$ 2.485,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	2485,17			
1.1.44	ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO	US	100,00	428,01	R\$ 42.801,00	22,00%	22,00	R\$ 9.416,22	6,00%	6,00	R\$ 2.568,06	28,00%	28,00	11984,28	72,00	30816,72			
1.1.45	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA	US	100,00	276,54	R\$ 27.654,00	8,00%	8,00	R\$ 2.212,32	4,00%	4,00	R\$ 1.106,16	12,00%	12,00	3318,48	88,00	24335,52			
1.1.46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC	UN	5,00	9.735,58	R\$ 48.677,90	20,00%	1,00	R\$ 9.735,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,00%	1,00	9735,58	4,00	38942,32			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 19/7/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Rua Cel Francisco Vermelho - Porto, Travessa C e Rua Helen Maria - Marambala, Rua Manoel Correa do Prado - Aeroparis, Rua Jerusalem - Padre Tiago e Praça Gaspar.

BM - Período de Referência da Medição: 12/06/2024 - 13/07/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

RS 85.189,85

BM - Número: 5

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 476.586,55

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado Inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)		
1.1.47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC	UN	4,00	14.464,30	RS 57.857,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	57857,20			
1.1.48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC	UN	3,00	20.333,20	RS 60.999,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	60999,60			
TOTAIS				RS 1.599.994,95			RS 391.396,70			RS 85.189,85			RS 476.586,55		RS 1.123.408,40				

Representante legal do município
Nome: Jorge Peres Filho
Cargo: Secretário de Obras Públicas

NADINE MARTINS
MAGALHAES 11216061645

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Nadine Martins Magalhães
CREA Nº: CREA RJ 2019101128/D

ELETRICA PADRAO DE MURIAE
LTDA:12759763000108

Responsável pela empresa contratada
Nome: Lindolfo Alves Dias
CPF: 722.642.766-49


Assinado de forma digital por
ELETRICA PADRAO DE MURIAE
LTDA:12759763000108
Dados: 2024.07.23 10:00:10 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CEL FRANCISCO VERMELHO - PORTO		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: PORTO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 12/6/2024	

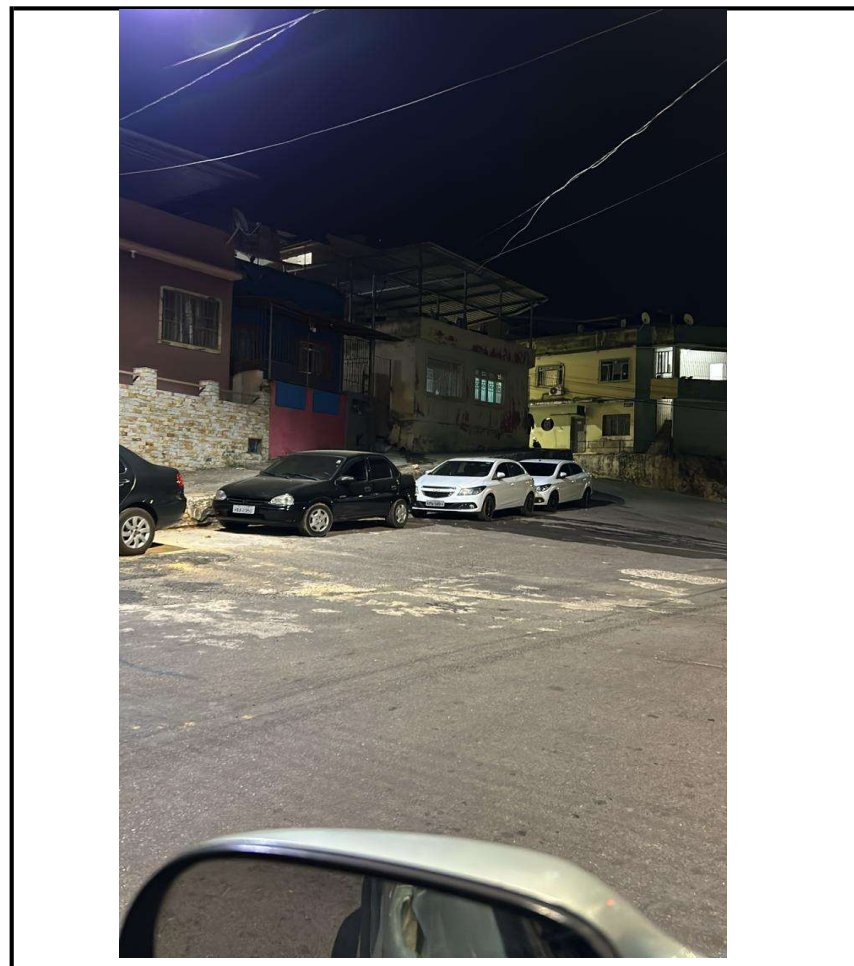



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXTENSÃO DE REDE	Empresa Contratada:	Elétrica Padrão de Muriaé Ltda
Local da Obra (Bairro, município e UF):	TRAVESSA C - MARAMBAIA	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data:	17/6/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: MARAMBAIA	







Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXTENSÃO DE REDE		Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé Ltda	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA MANOEL CORREA DO PRADO - AEROPORTO		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: AEROPORTO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 26/6/2024	

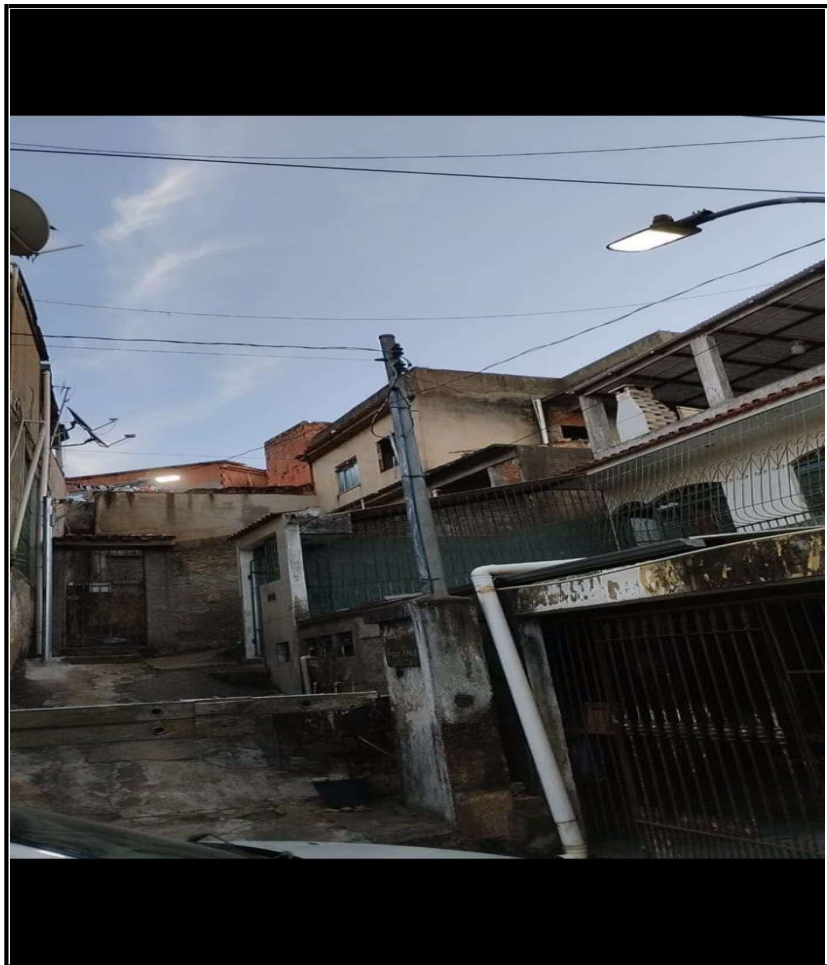



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXTENSÃO DE REDE	Empresa Contratada:	Elétrica Padrão de Muriaé Ltda
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA JERUSALEM - PADRE TIAGO	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Editais: 297/2023	Data:	1/7/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: PADRE TIAGO	





Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXTENSÃO DE REDE	Empresa Contratada:	Elétrica Padrão de Muriaé Ltda
Local da Obra (Bairro, município e UF):	PRAÇA PARTE ALTA - GASPAR	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Editais: 297/2023	Data:	8/7/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: PRAÇA GASPAR	



6 de jul de 2024 10:58:17
322 Rua B
Muriaé
Minas Gerais



6 de jul de 2024 10:57:18
393 Rua B
Gaspar
Muriaé
Minas Gerais



6 de jul de 2024 10:58:07
322 Rua B
Muriaé
Minas Gerais



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXTENSÃO DE REDE	Empresa Contratada:	Elétrica Padrão de Muriaé Ltda
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA HELEM MARIA - MARAMBAIA	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data:	20/6/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: RUA HELEM MARIA	

