
 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - O.S. 003																			
		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO								BM - Data de Emissão: 13/08/2024 BM - Período de Referência da Medição: 18/06/2024 A 12/08/2024				Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS							
		R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG								15/4/2024				CNPJ: 05.035.581/0001-10							
		Pregão Eletrônico: 195/2023				Ata: 588/2023		Valor da Medição: R\$ 90.654,37		Número: 03		Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 197.305,69		Valor Total Acumulado: R\$ 166.979,88		Serviços a executar					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM			
						%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>																					
<b>MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO</b>																					
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																					
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	190770,68450	R\$ 953,85	100,00%	0,0050	953,85	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	0,01	953,85	0,00	0,00					
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un.	1,00	6684,5200	R\$ 6.684,52	37,52%	0,3752	2507,97	44,44%	0,4444	2970,64	81,96%	0,82	5478,61	0,18	1205,91					
<b>3 SINALIZAÇÃO</b>																					
3.1	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	227,00	11,1139	R\$ 2.522,86	45,81%	104,0000	1155,85	11,89%	27,0000	300,08	57,70%	131,00	1455,93	96,00	1066,93					
<b>4 PLANILHA ORÇAMENTARIA</b>																					
4.1	PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	m2	4091,75	1,7322	R\$ 7.087,73	100,00%	4091,7500	7087,73	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	4.091,75	7087,73	0,00	0,00					
<b>5 PLACA DE OBRA</b>																					
5.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,00	274,3655	R\$ 548,73	100,00%	2,0000	548,73	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2,00	548,73	0,00	0,00					
<b>6 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>																					
6.1	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRAÇO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	257,36	16,6005	R\$ 4.272,30	80,17%	206,3200	3425,01	14,92%	38,4000	637,46	95,09%	244,72	4062,47	12,64	209,83					
6.2	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	38,92	7,8342	R\$ 304,88	1,39%	0,5400	4,23	59,98%	23,3420	182,87	61,37%	23,88	187,10	15,03	117,78					
<b>7 TRANSPORTE</b>																					
7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	10,51	20,5484	R\$ 216,05	0,00%	0,0000	0,00	9,99%	1,0504	21,58	9,99%	1,05	21,58	9,46	194,47					
7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	2,67	58,0314	R\$ 154,80	0,00%	0,0000	0,00	39,38%	1,0504	60,96	39,38%	1,05	60,96	1,62	93,84					
<b>8 PINTURA</b>																					
8.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2876,76	2,6114	R\$ 7.512,38	32,53%	935,7054	2443,50	67,47%	1941,0592	5088,88	100,00%	2.876,76	7512,38	0,00	0,00					
8.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1010,65	4,4051	R\$ 4.452,01	27,18%	274,6648	1209,93	31,48%	318,1408	1401,44	58,66%	592,81	2611,37	417,84	1840,64					
8.3	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	586,15	2,9631	R\$ 1.736,82	25,31%	148,3500	439,58	74,68%	437,9000	1297,25	100,00%	586,15	1736,83	0,00	-0,01					










ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO Nº:</b>	279/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2023
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	6/12/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

**DADOS DA SOLICITAÇÃO:**

SO Nº:

003-2024

Secretária Responsável:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto da solicitação:

MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																											
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																																													
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50																																											
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																																													
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO	UND.	1																																											
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>																																													
3.1	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	27,00																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>PERÍMETRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLOCO 3</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	PERÍMETRO	BLOCO 3	27,00	TOTAL	27,00																																							
LOCAL	PERÍMETRO																																													
BLOCO 3	27,00																																													
TOTAL	27,00																																													
<b>6</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>																																													
6.1	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	38,40																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>ÁREA</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 LADO CAMPO</td> <td>2,00</td> <td>1,60</td> <td>6,00</td> <td>19,2000</td> <td rowspan="2">(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA</td> </tr> <tr> <td>ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 SALAS</td> <td>2,00</td> <td>1,60</td> <td>6,00</td> <td>19,2000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ÁREA TOTAL</td> <td>38,4000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FÓRMULA	ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 LADO CAMPO	2,00	1,60	6,00	19,2000	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA	ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 SALAS	2,00	1,60	6,00	19,2000	ÁREA TOTAL				38,4000																							
LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FÓRMULA																																									
ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 LADO CAMPO	2,00	1,60	6,00	19,2000	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA																																									
ALAMBRADO FECHAMENTO BLOCO 2 SALAS	2,00	1,60	6,00	19,2000																																										
ÁREA TOTAL				38,4000																																										
6.2	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	23,3420																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ITEM</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>ÁREA</th> <th>FORMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">VÃOS DE COMPENSADO</td> <td>JANELAS 4 DIVISÓRIAS</td> <td>0,34</td> <td>1,34</td> <td>40,00</td> <td>18,22</td> <td rowspan="4">(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA</td> </tr> <tr> <td>JANELAS 8 DIVISÓRIAS</td> <td>0,20</td> <td>1,35</td> <td>9,00</td> <td>2,43</td> </tr> <tr> <td>PORTAS 2 ABAS</td> <td>0,92</td> <td>1,20</td> <td>2,00</td> <td>2,21</td> </tr> <tr> <td>PORTAS 8 DIVISÓRIAS</td> <td>0,20</td> <td>1,20</td> <td>2,00</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ÁREA TOTAL</td> <td>23,3420</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO								ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	40,00	18,22	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA	JANELAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,35	9,00	2,43	PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	2,00	2,21	PORTAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,20	2,00	0,48	ÁREA TOTAL					23,3420			
ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO																																														
	ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA																																								
VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	40,00	18,22	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA																																								
	JANELAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,35	9,00	2,43																																									
	PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	2,00	2,21																																									
	PORTAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,20	2,00	0,48																																									
ÁREA TOTAL					23,3420																																									
<b>7</b>	<b>TRANSPORTE</b>																																													
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	1,0504																																											





ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

**DADOS DA SOLICITAÇÃO:**

SO Nº:

003-2024

Secretária Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANT.	
7.1	ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME			
	COMPENSADO DE JANELAS	23,3420	0,03	0,70026			
	TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			1,0504			
7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA				m3	1,0504	
	ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME			
	COMPENSADO DE JANELAS	23,3420	0,03	0,70026			
	TOTAL			0,7003			
TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			1,0504				
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						
8.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA				m2	1941,0592	
	<b>ÁREA REFERENTE A LIXAMENTO DE PINTURA NOS BLOCOS MODULARES</b>						
		LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
	BLOCO 1	PINTURA ABAIXO DAS JANELAS	2,92	1,21	4	14,13	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE =ÁREA
	BLOCO 2	MURO DETALHE COLORIDO	24,00	2,15		51,60	
	BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV	PINTURA ABAIXO DAS JANELAS	2,92	1,21	52	183,73	
		FACHADAS LATERAIS	16,50	6,80		112,20	
		FACE PILARES	0,50	6,80	22	74,80	
		FACHADA FUNDOS COM DESENHO	17,50	2,50		43,75	
	ENTORNO	MURO DIVISA	471,00	3,15		1483,65	
	<b>ÁREA TOTAL</b>					1963,86	
	<b>ÁREA A DESCONTAR DE VÃOS</b>						
	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA		
BLOCO 1	FACHADA ACESSO COM DESENHO	9,50	2,40	1	22,80		
<b>ÁREA A DESCONTAR DE VÃOS</b>					22,80		
<b>ÁREA TOTAL REMANESCENTE</b>					1941,06		
8.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA				m2	318,14	
	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS E QUADROS DE ALAMBRADO						
ÁREA DO ITEM 8.9							
	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA				m2	437,80	
	<b>LIXAMENTO PARTE INFERIOR DAS MARQUISES</b>						
BLOCO 1	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA	





ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO N°:</b>	279/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2023
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	6/12/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

**DADOS DA SOLICITAÇÃO:**

SO N°:

003-2024

Secretária Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.																																												
8.3	BLOCO 2	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	12	63,00	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA																																													
		MARQUISE MENOR	2,50	1,42	16	56,80																																														
	BLOCO 3	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	20	105,00																																														
		MARQUISE MENOR	2,50	1,42	60	213,00																																														
	ÁREA TOTAL							437,80																																												
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA						m2	202,816																																												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ÁREA DO ITEM 8.11</td> <td>202,816</td> </tr> </table>						ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS						ÁREA DO ITEM 8.11						202,816																																	
ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS																																																				
ÁREA DO ITEM 8.11						202,816																																														
8.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO						m2	437,80																																												
	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">APLICAÇÃO DE FUNDO NA PARTE INFERIOR DAS MARQUISES</th> </tr> <tr> <th>BLOCO</th> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>LARGURA</th> <th>QUANTI</th> <th>ÁREA</th> <th>FORMULA</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">BLOCO 2</td> <td>MARQUISE MAIOR</td> <td>2,50</td> <td>2,1</td> <td>12</td> <td>63,00</td> <td rowspan="5">(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE=ÁREA</td> </tr> <tr> <td>MARQUISE MENOR</td> <td>2,50</td> <td>1,42</td> <td>16</td> <td>56,80</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BLOCO 3</td> <td>MARQUISE MAIOR</td> <td>2,50</td> <td>2,1</td> <td>20</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>MARQUISE MENOR</td> <td>2,50</td> <td>1,42</td> <td>60</td> <td>213,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ÁREA TOTAL</td> <td>437,80</td> </tr> </table>						APLICAÇÃO DE FUNDO NA PARTE INFERIOR DAS MARQUISES							BLOCO	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA	BLOCO 2	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	12	63,00	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE=ÁREA	MARQUISE MENOR	2,50	1,42	16	56,80	BLOCO 3	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	20	105,00	MARQUISE MENOR	2,50	1,42	60	213,00	ÁREA TOTAL						437,80		
	APLICAÇÃO DE FUNDO NA PARTE INFERIOR DAS MARQUISES																																																			
	BLOCO	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA																																													
	BLOCO 2	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	12	63,00	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE=ÁREA																																													
MARQUISE MENOR		2,50	1,42	16	56,80																																															
BLOCO 3	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	20	105,00																																															
	MARQUISE MENOR	2,50	1,42	60	213,00																																															
ÁREA TOTAL						437,80																																														
8.6	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS						m2	699,23																																												
	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE</th> </tr> <tr> <th>LOCAL</th> <th>ITEM</th> <th>COMPRIMENTO OU PERÍMETRO</th> <th>LARGURA OU ALTURA</th> <th>QUANT</th> <th>ÁREA</th> <th>FORMULA</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV</td> <td>DUTOS DE VENTILAÇÃO</td> <td>3,00</td> <td>1,80</td> <td>47</td> <td>253,80</td> <td rowspan="4">(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA</td> </tr> <tr> <td>MARQUISE MAIOR</td> <td>3,40</td> <td>2,10</td> <td>20</td> <td>142,80</td> </tr> <tr> <td>MARQUISE MENOR</td> <td>3,30</td> <td>1,45</td> <td>57</td> <td>272,75</td> </tr> <tr> <td>BEIRAL DA LAJE</td> <td>149,40</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>29,88</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ÁREA TOTAL</td> <td>699,23</td> </tr> </table>						ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE							LOCAL	ITEM	COMPRIMENTO OU PERÍMETRO	LARGURA OU ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA	BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV	DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	47	253,80	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA	MARQUISE MAIOR	3,40	2,10	20	142,80	MARQUISE MENOR	3,30	1,45	57	272,75	BEIRAL DA LAJE	149,40	0,20		29,88	ÁREA TOTAL						699,23			
	ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE																																																			
	LOCAL	ITEM	COMPRIMENTO OU PERÍMETRO	LARGURA OU ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA																																													
	BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV	DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	47	253,80	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA																																													
MARQUISE MAIOR		3,40	2,10	20	142,80																																															
MARQUISE MENOR		3,30	1,45	57	272,75																																															
BEIRAL DA LAJE		149,40	0,20		29,88																																															
ÁREA TOTAL						699,23																																														
8.7	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO						m2	1941,06																																												
	ÁREA DO ITEM 8.8 + ÁREA DO ITEM 8.12						1941,06																																													
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						m2	1608,50																																												
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE																																																			





ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

**DADOS DA SOLICITAÇÃO:**

Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SO Nº:	003-2024
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)		

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.8	ENTORNO	LOCAL	PERIMETRO	ALTURA	ÁREA	FORMULA	
		MURO DE DIVISA	471,00	3,15	1483,65		
	BLOCO 3	FACE PILARES	0,50	3,40	37,40		
		PAREDES LATERAIS ACIMA DO BARRAMENTO	16,50	5,30	87,45		
<b>ÁREA TOTAL</b>					<b>1608,50</b>		

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2

318,1408

LOCAL	ESQUADRIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA
BLOCO 3	JANELA 4 DIVISÓRIAS	2,48	1,65	40,00	163,6800	(COMPRIMENTO*AL TURA)*QUANTIDA DE = ÁREA
	JANELAS 8 DIVISORIAS	2,48	1,65	4	16,3680	
	PORTAS 2 ABAS	2,48	2,64	2	13,0944	
	PORTÕES COZINHA	1,25	1,80	2	4,5000	
BLOCO 1,2 E 3	BASCULAS	5,10	0,06	46,00	14,0760	
BLOCO 1,2 E 3	MARCO DE PORTAS	7,76	0,30	2,00	4,656	
<b>SOMATÓRIO DAS ÁREAS</b>					<b>216,3744</b>	
<b>ÁREA A DESCONTAR DE COMPENSADO</b>						
	ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE ESQUADRIA * QUANTIDADE COMPENSADO	ÁREA A DESCONTAR	
VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISORIAS	0,34	1,34	160,00	72,896	
	JANELAS 8 DIVISORIAS	0,20	1,35	32,00	8,6400	
	PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	4,00	4,416	
<b>ÁREA TOTAL A DESCONTAR</b>					<b>85,9520</b>	
<b>ÁREA COM DESCONTO</b>					<b>130,4224</b>	
<b>ÁREA COM DESCONTO x 2 (lado interno e externo)</b>					<b>260,8448</b>	
BLOCOS 1,2 E 3	GRADES	2,48	1,65	12	49,1040	
<b>ÁREA TOTAL COM DESCONTO DE PINTURA DE ESQUADRIAS</b>					<b>309,9488</b>	

8.9

**ÁREA DE PINTURA DE QUADROS METÁLICOS DE ALAMBRADO**

LOCAL	ITEM	CIRCUNFERENCIA DO TUDO	COMPRIMENTO DO TUBO	QUANTID	ÁREA
BLOCO 2 E 3	TUBOS VERTICAIS ALAMBRADO FECHAMENTO LADO CAMPO	0,16	1,60	7	1,7920
	TUBOS HORIZONTAIS ALAMBRADO FECHAMENTO LADO CAMPO	0,16	6,00	2	1,9200





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>SO Nº:</b>	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.	
	TUBOS VERTICAIS ALAMBRADO FECHAMENTO SALAS	0,16	1,60	10	2,5600				
	TUBOS HORIZONTAIS ALAMBRADO FECHAMENTO SALAS	0,16	6,00	2	1,9200				
<b>ÁREA TOTAL PINTURA QUADROS DE ALAMBRADO</b>						8,1920			
<b>ÁREA DE PINTURA DESUPERFÍCIES METÁLICAS</b>									
ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS + ÁREA DE PINTURA DE QUADROS DE ALAMBRADO						318,1408			
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						m2	437,80	
8.10	<b>PINTURA PARTE INFERIOR DAS MARQUISES</b>								
	BLOCO 1	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA		
	BLOCO 2	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	12	63,00	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE=ÁREA		
		MARQUISE MENOR	2,50	1,42	16	56,80			
	BLOCO 3	MARQUISE MAIOR	2,50	2,1	20	105,00			
		MARQUISE MENOR	2,50	1,42	60	213,00			
	<b>ÁREA TOTAL</b>							437,80	
		PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO						m2	202,816
8.11	<b>ÁREA DE PINTURA DE COMPENSADO</b>								
		ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE ESQUADRIA	QUANTIDADE DE COMPENSADO POR ESQUADRIA		ÁREA	FORMULA
	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISORIAS	0,34	1,34	40,00	4,00	72,896	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE DE ESQUADRIAS*QUANTIDADE DE COMPENSADO) = ÁREA x 2 LADOS =ÁREA TOTAL	
		JANELAS 8 DIVISORIAS	0,20	1,35	4,00	8,00	8,6400		
		PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	9,00	2,00	19,8720		
	<b>ÁREA</b>						101,408		
<b>ÁREA TOTAL</b>						202,816			
	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						m2	332,56	
	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA			

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO N°:</b>	279/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2023
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	6/12/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

**DADOS DA SOLICITAÇÃO:**

<b>Secretária Responsável:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>SO N°:</b>	003-2024
<b>Objeto da solicitação:</b>	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)		

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.
8.12	BLOCO 1	PINTURA ABAIXO DAS JANELAS	2,92	1,21	4	14,13	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE =ÁREA	
	BLOCO 2	MURO DETALHE COLORIDO	24,00	2,15		51,60		
	BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV	PINTURA ABAIXO DAS JANELAS	2,92	1,21	52	183,73		
		FACHADAS LATERAIS	16,50	1,50		24,75		
		FACE PILARES	0,50	3,40	22	37,40		
		FACHADA FUNDOS COM DESENHO	17,50	2,50		43,75		
	<b>ÁREA TOTAL</b>							355,36
	ÁREA A DESCONTAR DE VÃOS							
		LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT			
	BLOCO 1	FACHADA ACESSO COM DESENHO	9,50	2,40	1	22,80		
<b>ÁREA TOTAL</b>						22,80		
<b>TOTAL GERAL</b>						332,56		

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF\_05/2021

M2

1922,40

ITEM	ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE						FORMULA	
	ITEM	COMPRIMENTO OU PERÍMETRO	LARGURA OU ALTURA	QUANT	ÁREA			
8.13	BLOCO 1	DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	44	237,60	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA	
		MARQUISE MAIOR	3,40	2,10	24	171,36		
		MARQUISE MENOR	3,30	1,45	8	38,28		
		BEIRAL DA LAJE	130,42	0,20		26,08		
	BLOCO 2	DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	54	291,60		
		MARQUISE MAIOR	3,40	2,10	12	85,68		
		MARQUISE MENOR	3,30	1,45	33	157,91		
		BEIRAL DA LAJE	163,57	0,20		32,71		
	BLOCO 3 TÉRREO E 1º PAV	DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	47	253,80		
		MARQUISE MAIOR	3,40	2,10	20	142,80		
		MARQUISE MENOR	3,30	1,45	57	272,75		
		BEIRAL DA LAJE	149,40	0,20		29,88		
	PASSEIO	ACESSO BLOCO 1 E 2	72,78	2,50		181,95		
	<b>ÁREA TOTAL</b>							1922,40

10 SERRALHERIA





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Educação

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>SO Nº:</b>	003-2024
<b>Secretária Responsável:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Objeto da solicitação:</b>	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
10.2	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	m2	23,3420				
	<b>ÁREA DE COMPENSADO A SUBSTITUIR EM JANELAS E PORTAS</b>						
		<b>ITEM</b>	<b>COMPRI-MENTO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ÁREA</b>	<b>FORMULA</b>
	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	40,00	18,22	(COMPRI-MENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA
		JANELAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,35	9,00	2,43	
		PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	2,00	2,21	
		PORTAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,20	2,00	0,48	
	ÁREA TOTAL					23,3420	
	11	<b>LIMPEZA</b>					
	11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	576,00			
<b>LIMPEZA PERÍMETRO DE PINTURA</b>							
		<b>LOCAL</b>	<b>PERÍMETRO (M)</b>	<b>LARGURA (M)</b>	<b>ÁREA (M2)</b>	<b>FÓRMULA</b>	
		BLOCO 1	150,00	2,00	300,00	PERÍMETRO*COMPRI-MENTO= ÁREA	
		BLOCO 2	138,00	2,00	276,00		
		TOTAL			576,00		

*Barroso*

**BRENNER BARROSO**  
VIEIRA:12775056750

Assinado de forma digital por BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:56:23 -03'00'

*Correa*

**ALEX CORREA**  
LOUREIRO:08455411708

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708 c=BR o=(CP-Brasil ou=AC SyngularID Multipla Reason: I am the author of this document Location: Date: 2024-08-15 16:00:03:00)





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF): R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ: 05.035.581/0001-10	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 195/2023	Ata: 588/2023	Data: 13/8/2024	



Observações:

Foto 1: REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO (BLOCO 2 E 3)

Foto 2: TELA PVC PARA ISOLAMENTO PARA PINTURA DE QUADROS DE ALAMBRADO

Representante do Município  
Atan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por BRENNER BARROSO VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:56:51 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO, o=8455411708  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2024.08.15 16:00:03.00






**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF): R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ: 05.035.581/0001-10	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 195/2023	Ata: 588/2023	Data: 13/8/2024	

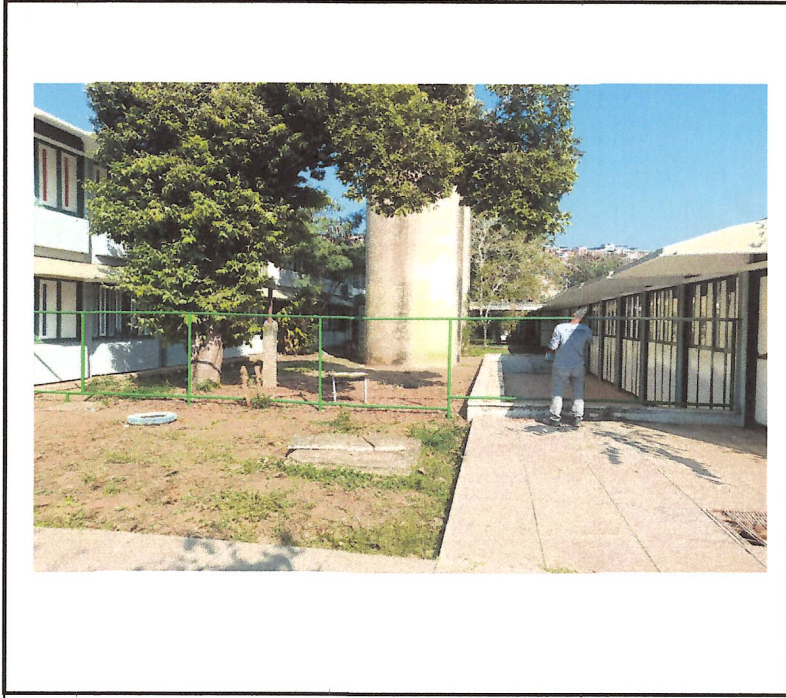

Observações:

Foto 3: PINTURA DE QUADROS DE ALAMBRADO

Foto 4: LIMPEZA E LIXAMENTO ENTORNO DO MURO

Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:57:17 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:0845  
5411708  
Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO, o=ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, ou=AC SygnatID Multipla Reason: I am the author of this document Date: 2024.08.15 16:01:03.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF): R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ: 05.035.581/0001-10	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 195/2023	Ata: 588/2023	Data: 13/8/2024	



Observações:

Foto 5: LIXAMENTO EM PAREDES

Foto 6: LIXAMENTO EM COMPENSADO DE MADEIRA

Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação  
Maria Cristina Naylor de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750

Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:57:27 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA N°: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455  
411708

Digitally signed by ALEX CORREA  
LOUREIRO 08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA  
LOUREIRO 08455411708, o=BR, ou=ICP-Brasil  
c=BR, st=Paraná, ou=Paraná  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024-08-15 16:01:03.00

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro






**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ:	05.035.581/0001-10	Etapa: (2)
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023	Data:	13/8/2024
					1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra

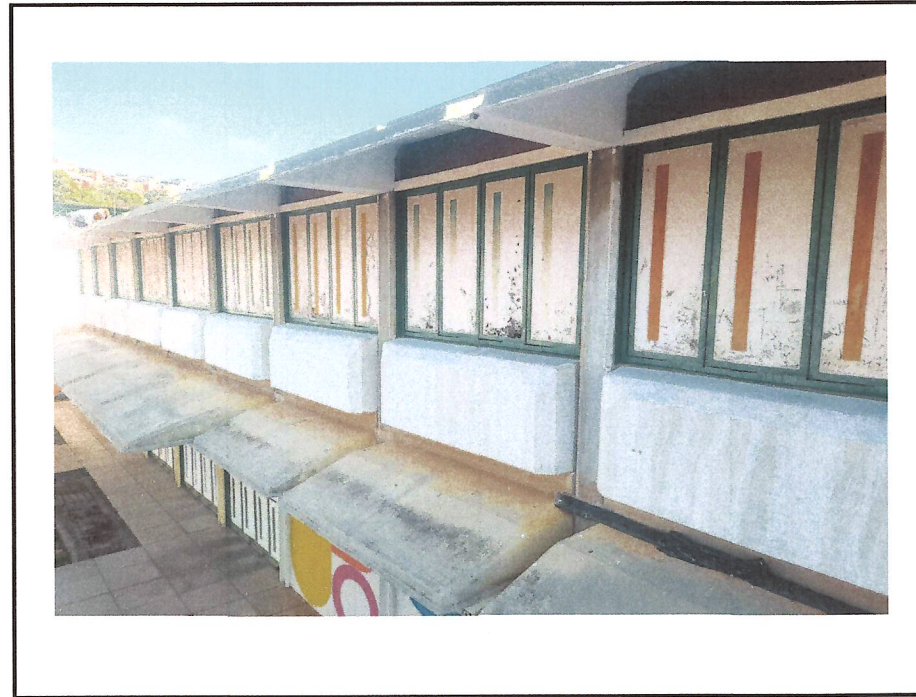

Observações:

Foto 7: PREPARAÇÃO PARA PINTURA COM APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

Foto 8: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

Representante do Município  
Arian do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750

Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:57:38 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455  
411708

Digitally signed by ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708, o=BR, ou=CP-Brasil  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 16:01:03.00

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		Ata:	588/2023	Data:		13/8/2024	
						2 - durante a realização da obra	
						3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 9: PINTURA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO, BEIRAIS E MARQUISES (BLOCO 3)

Foto 10: PINTURA DE ELEMENTOS DE CONCRETO

Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:57:51 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA N°: MG 189511//D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:084554  
11708  
Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA,  
LOUREIRO:08455411708, o=BR on CP=Brasil  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 16:01:03.00






**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**


Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		195/2023	Ata:	588/2023	Data:	2 - durante a realização da obra	
					13/8/2024	3 - após a realização da obra	

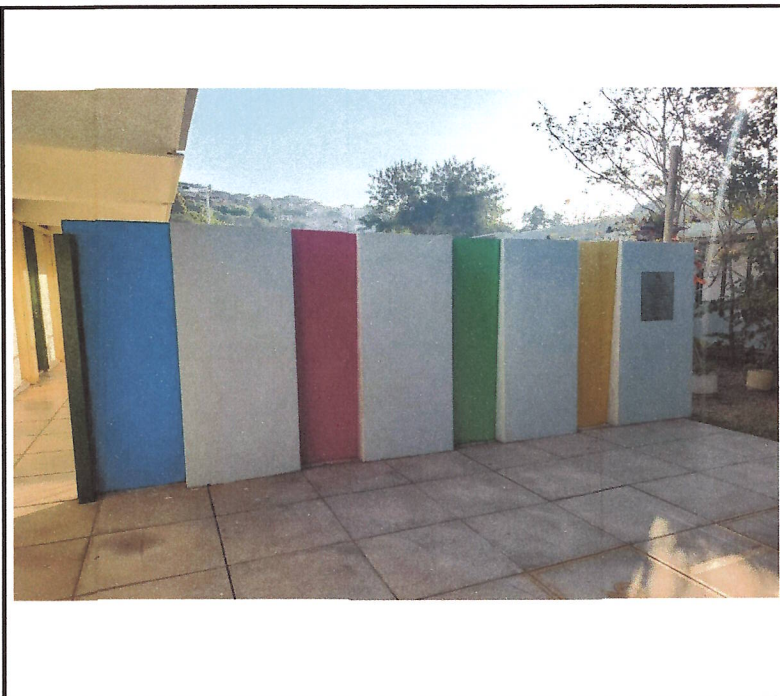


Observações:

Foto 11: PINTURA DE MURO

Foto 12: PINTURA DE DESENHOS

  
Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

  
Secretaria Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

**BRENNER BARROSO**  
**VIIEIRA:12775056750**  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:01 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

**ALEX CORREA**  
**LOUREIRO:0845**  
**5411708**  
Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708 c=BR  
o=ICP-Brasil ou=AC SingularID Multiple  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 18:02:03.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		195/2023	Ata:	588/2023	Data:	13/8/2024	
						2 - durante a realização da obra	
						3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 13: PINTURA DE PAREDE COM TINTA ESMALTE

Foto 14: PINTURA DE JANELAS E SUBSTITUIÇÃO DE COMPENSADO EM JANELAS

Representante do Município  
Arián do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

**BRENNER BARROSO**  
**VIEIRA:12775056750**

Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:11 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA N°: MG 189511/D

**ALEX CORREA**  
**LOUREIRO:0845**  
**5411708**

Digitally signed by ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708, e=BR  
@GPR-Brazil.org, AC=SingularID, Multiple  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 15:02:03.00

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro






**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**


Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		195/2023	Ata:	588/2023	Data:	2 - durante a realização da obra	
					13/8/2024	3 - após a realização da obra	

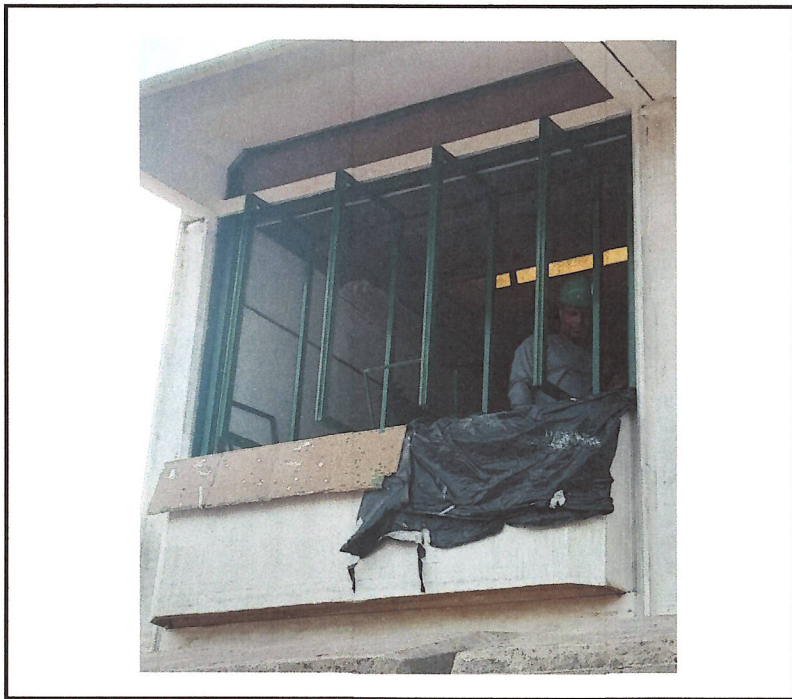



Observações:

Foto 15: REMOÇÃO DE COMPENSADO DE JANELAS

Foto 16: PREPARAÇÃO DE COMPENSADO DE MADEIRA PARA PINTURA

  
Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

  
Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

**BRENNER BARROSO**  
VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:22 -03'00'  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

**ALEX CORREA**  
LOUREIRO:084  
55411708

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708, o=BR, email=alex@ilumiterra.com.br, c=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location  
Date: 2024.08.15 16:02:03.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF): R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ: 05.035.581/0001-10	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 195/2023	Ata: 588/2023	Data: 13/8/2024	



Observações:

Foto 17: PINTURA EM COMPENSADO DE MADEIRA

Foto 18: SUBSTITUIÇÃO DE COMPENSADOS EM PORTAS E JANELAS

Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:34 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA N°: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455  
411708

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708, o=BR, ou=CP-Brasil, email=AC\_Signatario\_Multiple@brasil.com.br, c=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 16:02:03.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF): R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ: 05.035.581/0001-10	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 195/2023	Ata: 588/2023	Data: 13/8/2024	



Observações:

Foto 19: PINTURA DE MURO

Foto 20: PINTURA DE MURO

Representante do Município  
Arian do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

**BRENNER BARROSO**  
VIEIRA:12775056750

Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:46 -03'00'  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

**ALEX CORREA**  
LOUREIRO:0845  
5411708

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708 DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708, e=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, by=AlexCorrea Loureiro, Reason: I am the author of this document. Date: 2024.08.15 16:02:03.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**


Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		Ata:	588/2023	Data:		2 - durante a realização da obra	
195/2023				13/8/2024		3 - após a realização da obra	





Observações:

Foto 21: PINTURA MURO FINALIZADA

Foto 22: PINTURA LATERAL DO CAMPO BLOCO 3

  
Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

  
Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:58:57 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA N°: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:084  
55411708  
Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro

Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708 DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-Regulada, Multia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2024.08.15 16:03:05.00





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03 - O.S. 003**

Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):				CNPJ:		Etapa: (2)	
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG				05.035.581/0001-10		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico:		195/2023	Ata:	588/2023	Data:	2 - durante a realização da obra	
					13/8/2024	3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 23: PINTURA DE PAREDE, TETO E JANELAS

Foto 24: PINTURA DE JANELAS, TETO, MARQUISES E PAREDE FINALIZADA

Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação  
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Ana Carolina Antunes p. Dantas  
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750

Assinado de forma digital por  
BRENNER BARROSO  
VIEIRA:12775056750  
Dados: 2024.08.15 15:59:08 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Brenner Barroso Vieira  
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455  
411708

Digitally signed by ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708  
DN: cn=ALEX CORREA  
LOUREIRO:08455411708, o=BR, ou=ICP-Brasil  
Reason: I am the issuer of this document  
Location:  
Date: 2024.08.15 16:03:03.00

Representante legal da empresa  
Alex Correa Loureiro
