

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão:		27/06/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
										BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025					
		Local da Obra (Bairro, município e UF): CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 21/05/2025		BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)		CNPJ: 18.973.779/0001-97		Valor do Contrato: R\$ 14.474,90	
ORDEN DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 14.474,90		Valor Medido Acumulado: R\$ 14.474,90					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)
OS 003 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ENTRADA DO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM																	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 657,54	R\$ 657,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 657,54	100%	1,00	R\$ 657,54	-	-	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	R\$ 263,71	R\$ 527,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 527,42	100%	2,00	R\$ 527,42	-	-	R\$ 0,00
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4,38	R\$ 8,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 8,76	100%	2,00	R\$ 8,76	-	-	R\$ 0,00
2.3	PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	15,00	R\$ 9,46	R\$ 141,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	15,0000	R\$ 141,90	100%	15,00	R\$ 141,90	-	-	R\$ 0,00
3	FACHADA/ENTRADA																
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,74	R\$ 74,22	R\$ 129,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,7400	R\$ 129,14	100%	1,74	R\$ 129,14	-	-	R\$ 0,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,63	R\$ 5,52	R\$ 169,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	30,6300	R\$ 169,08	100%	30,63	R\$ 169,08	-	-	R\$ 0,00
3.3	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	38,87	R\$ 3,07	R\$ 119,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	38,8700	R\$ 119,33	100%	38,87	R\$ 119,33	-	-	R\$ 0,00
3.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,20	R\$ 7,99	R\$ 49,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	6,2000	R\$ 49,54	100%	6,20	R\$ 49,54	-	-	R\$ 0,00
3.5	SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO	UNID.	1,00	R\$ 791,99	R\$ 791,99	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 791,99	100%	1,00	R\$ 791,99	-	-	R\$ 0,00
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,63	R\$ 5,60	R\$ 171,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	30,6300	R\$ 171,53	100%	30,63	R\$ 171,53	-	-	R\$ 0,00
3.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	34,37	R\$ 36,13	R\$ 1.241,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	34,3700	R\$ 1.241,79	100%	34,37	R\$ 1.241,79	-	-	R\$ 0,00
3.8	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	7,74	R\$ 6,15	R\$ 47,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,7400	R\$ 47,60	100%	7,74	R\$ 47,60	-	-	R\$ 0,00
3.9	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	21,31	R\$ 7,72	R\$ 164,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	21,3053	R\$ 164,48	100%	21,31	R\$ 164,48	-	-	R\$ 0,00
3.10	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	21,31	R\$ 21,84	R\$ 465,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	21,3053	R\$ 465,31	100%	21,31	R\$ 465,31	-	-	R\$ 0,00
3.11	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	7,74	R\$ 13,57	R\$ 105,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,7400	R\$ 105,03	100%	7,74	R\$ 105,03	-	-	R\$ 0,00
3.12	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	7,74	R\$ 14,64	R\$ 113,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	7,7400	R\$ 113,31	100%	7,74	R\$ 113,31	-	-	R\$ 0,00
3.13	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	21,31	R\$ 16,12	R\$ 343,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	21,3053	R\$ 343,44	100%	21,31	R\$ 343,44	-	-	R\$ 0,00



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG					
ORDEN DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		27/06/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97		
ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	1,00	
	Critérios da Administração			Qtde			
	Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00			
	Total:			1,00	UN		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				M2	2,00	
	Face intervenção	Comprimento	Altura	Área			
	Placa de Obra	2,00	1,00	2,00			
	Total:			2,00	M2		
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO				UN	2,00	
	Uso		Área				
	Sinalizadores		2,00				
	Total:		2,00	UN			
2.3	PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO				M	15,00	
	Uso		Área				
	Perímetro de interferência		15,00				
	Total:		15,00	M			
3	FACHADA/ENTRADA						
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PORADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE 12/2021				M2	1,74	
	Descrição	Área	Quantidade	Área			
	Fechamento do "X" da entrada	0,435	4	1,74	Área x quantidade		
				1,74	M2		



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		27/06/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97	
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					M2	30,63
						</	



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)																																			
Local da Obra (Bairro, município e UF):		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG																																						
ORDEM DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																																				
BM - Data de Emissão:		27/06/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																				
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																																				
3.6	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Parede divisória da entrada</td><td>10,188</td><td>2</td><td>21,02</td><td>$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$</td></tr><tr><td>Frente e fundo do "X" da entrada</td><td>2,42</td><td>2</td><td>4,84</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Laterais do "X" da entrada</td><td>1,45</td><td>2</td><td>2,90</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Altura da laje</td><td>1,868</td><td>1</td><td>1,87</td><td>Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>30,63</td><td>M2</td></tr></table>					Descrição	Área	Quantidade	Área		Parede divisória da entrada	10,188	2	21,02	$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade	Altura da laje	1,868	1	1,87	Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$	Total			30,63	M2					
	Descrição	Área	Quantidade	Área																																				
	Parede divisória da entrada	10,188	2	21,02	$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$																																			
	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade																																			
	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade																																			
	Altura da laje	1,868	1	1,87	Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$																																			
Total			30,63	M2																																				
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022					M2 34,37																																			
3.7	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Parede divisória da entrada</td><td>10,188</td><td>2</td><td>21,02</td><td>$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$</td></tr><tr><td>Laje parte interna portão</td><td>3,10</td><td>1</td><td>3,75</td><td>Largura: 0,50m Comprimento: 6,20m</td></tr><tr><td>Frente e fundo do "X" da entrada</td><td>2,42</td><td>2</td><td>4,84</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Laterais do "X" da entrada</td><td>1,45</td><td>2</td><td>2,90</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Altura da laje</td><td>1,868</td><td>1</td><td>1,87</td><td>Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>34,37</td><td>M2</td></tr></table>					Descrição	Área	Quantidade	Área		Parede divisória da entrada	10,188	2	21,02	$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$	Laje parte interna portão	3,10	1	3,75	Largura: 0,50m Comprimento: 6,20m	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade	Altura da laje	1,868	1	1,87	Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$	Total			34,37	M2
	Descrição	Área	Quantidade	Área																																				
	Parede divisória da entrada	10,188	2	21,02	$((3,6*2,58)+(0,25*3,6))*2+(0,25*2,58)$																																			
	Laje parte interna portão	3,10	1	3,75	Largura: 0,50m Comprimento: 6,20m																																			
	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade																																			
	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade																																			
Altura da laje	1,868	1	1,87	Perímetro*altura: $(6,21*2+3,13*2)*0,10$																																				
Total			34,37	M2																																				
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO					M2 7,74																																			
3.8	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Frente e fundo do "X" da entrada</td><td>2,42</td><td>2</td><td>4,84</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Laterais do "X" da entrada</td><td>1,45</td><td>2</td><td>2,90</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>7,74</td><td>m2</td></tr></table>					Descrição	Área	Quantidade	Área		Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade	Total			7,74	m2															
	Descrição	Área	Quantidade	Área																																				
	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade																																			
Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade																																				
Total			7,74	m2																																				



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)																				
Local da Obra (Bairro, município e UF):		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG																								
ORDEN DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																					
BM - Data de Emissão:		27/06/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																					
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97																					
3.9	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO				M2	21,31																				
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Laje</td><td>6,21</td><td>3,13</td><td>19,44</td><td>Comprimento x largura</td></tr><tr><td>Laje altura</td><td>0,10</td><td>18,68</td><td>1,87</td><td>Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>21,31</td><td>M2</td></tr></table>				Descrição	Área	Quantidade	Área		Laje	6,21	3,13	19,44	Comprimento x largura	Laje altura	0,10	18,68	1,87	Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)	Total			21,31	M2		
	Descrição	Área	Quantidade	Área																						
	Laje	6,21	3,13	19,44	Comprimento x largura																					
Laje altura	0,10	18,68	1,87	Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)																						
Total			21,31	M2																						
3.10	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA				M2	21,31																				
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Laje</td><td>6,21</td><td>3,13</td><td>19,44</td><td>Comprimento x largura</td></tr><tr><td>Laje altura</td><td>0,10</td><td>18,68</td><td>1,87</td><td>Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>21,31</td><td>M2</td></tr></table>				Descrição	Área	Quantidade	Área		Laje	6,21	3,13	19,44	Comprimento x largura	Laje altura	0,10	18,68	1,87	Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)	Total			21,31	M2		
	Descrição	Área	Quantidade	Área																						
	Laje	6,21	3,13	19,44	Comprimento x largura																					
Laje altura	0,10	18,68	1,87	Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)																						
Total			21,31	M2																						
3.11	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO				M2	7,74																				
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Frente e fundo do "X" da entrada</td><td>2,42</td><td>2</td><td>4,84</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Laterais do "X" da entrada</td><td>1,45</td><td>2</td><td>2,90</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>7,74</td><td>M2</td></tr></table>				Descrição	Área	Quantidade	Área		Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade	Total			7,74	M2		
	Descrição	Área	Quantidade	Área																						
	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade																					
Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade																						
Total			7,74	M2																						
3.12	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)				M2	7,74																				
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr><tr><td>Frente e fundo do "X" da entrada</td><td>2,42</td><td>2</td><td>4,84</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td>Laterais do "X" da entrada</td><td>1,45</td><td>2</td><td>2,90</td><td>Área x quantidade</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>7,74</td><td>M2</td></tr></table>				Descrição	Área	Quantidade	Área		Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade	Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade	Total			7,74	M2		
	Descrição	Área	Quantidade	Área																						
	Frente e fundo do "X" da entrada	2,42	2	4,84	Área x quantidade																					
Laterais do "X" da entrada	1,45	2	2,90	Área x quantidade																						
Total			7,74	M2																						
	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)				M2	21,31																				
	<table><tr><th>Descrição</th><th>Área</th><th>Quantidade</th><th>Área</th><th></th></tr></table>				Descrição	Área	Quantidade	Área																		
Descrição	Área	Quantidade	Área																							



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG						
ORDEN DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		27/06/2025			Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025			CNPJ:	18.973.779/0001-97		
3.13		Laje	6,21	3,13	19,44	Comprimento x largura		
		Laje altura	0,10	18,68	1,87	Altura da laje * perímetro (6,21*2+3,13*2)		
		Total			21,31	M2		
3.14	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO					M2	7,75	
	Descrição	Comprimento	Altura	Desc vão	Área	Comp. x altura x desconto aberturas		
	Portão fachada	6,20	2,50	50%	7,75	Área x quantidade		
		Total			7,75			
3.15	REVESTIMENTO COM GRANITO, TIPO SÃO GABRIEL, APLICADO EM PAREDE, ESP. 3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE EXTERNO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CONFORME PROJETO)					M2	20,77	
3.16	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO					M2	20,00	
	Descrição	Comprimento	Largura	Área	Comprimento x largura			
	Piso entrada	6,40	3,00	20,00	m2			
		Total			20,00			
3.17	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019					M3	0,68	
	Descrição	Comprimento	Largura	Espessura	Volume	Comprimento x largura x espessura		
	Cobertura laje	6,21	3,13	0,035	0,68			



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)	
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		003/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		27/06/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		21/05/2025 – 27/06/2025				CNPJ:
	Total		0,68	m3		
4 ENTREGA DA OBRA						
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA				M3	0,92
	Descrição	Área	Espessura	Volume	Área x espessura	
	Revestimento cerâmico removido	30,63	0,03	0,92		
	Total		0,92	M3		
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA				M3	0,92
	Descrição	Área	Espessura	Volume	Área x espessura	
	Revestimento cerâmico removido	30,63	0,03	0,92		
	Total		0,92	M3		
4.3	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA				M2	30,00
	Descrição	Área				
	Área ao redor da entrada	30,00				
	Total	30,00	M2			


JORGE FERES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

MAYKO TORRES
BOALENTO:10683
296612
Assinado digitalmente por MAYKO TORRES BOALENTO:10683296612
Data: 2025.06.30 13:58:30 -03'00'

MAYKO TORRES BOALENTO
Engenheiro Civil
MG0000245271D MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.06.27 10:15:44 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.27 11:41:29 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
82
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.06.27 10:16:28 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS PELA				Data de Emissão:	27/06/2025
Local da Obra:		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG				CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEM DE SERVIÇO:	003/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 003 CEMITÉRIO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ENTRADA DO CEMITÉRIO SENHOR BONFIM

INÍCIO DA OBRA: 26/06/2025
PRazo DE EXECUÇÃO: 40 DIAS
EMPRESA EXECUTORA: ISM CONSTRUÇÕES
VALOR DA OBRA: R\$ 14.404,90

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, IPORQUE SE PREVEEM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

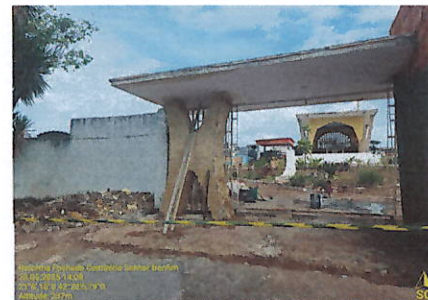

OBSERVAÇÕES:

MAYKO TORRES BOALENTO
Assinado digitalmente por MAYKO TORRES
BOALENTO:10883296612
3296612
Data: 2025.06.30
14:01:44-03'00'

MAYKO TORRES BOALENTO
Engenheiro Civil
MG0000245271D MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
FONSECA:10449588637
88637
Dados: 2025.06.27
10:17:15 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ
CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.27
11:41:54 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 21150/D

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA
MOURA:12997073782
3782
Dados: 2025.06.27
10:24:24 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO


Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DEB A			Data de Emissão:	27/06/2025
	Local da Obra:	CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOMFIM, MURIAÉ-MG			CNPJ:
ORDEN DE SERVIÇO:	003/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
				BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bonfim
28.05.2025 14:01
21° 8' 34" S 42° 22' 6" O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:

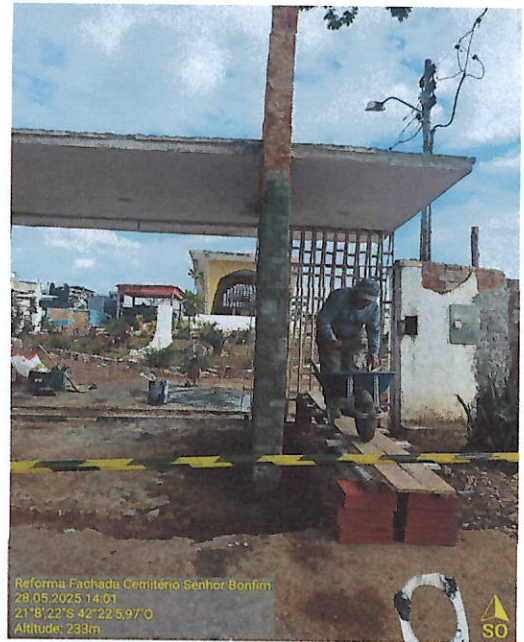

Reforma Fachada Cemitério Senhor Bonfim
28.05.2025 14:01
21° 8' 22" S 42° 22' 5,97" O
Altitude: 233m

OBSERVAÇÕES:



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bonfim
28.05.2025 14:01
21° 8' 34" S 42° 22' 6" O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bonfim
06.06.2025 09:32
21° 8' 02" S 42° 22' 5,98" O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bonfim
06.06.2025 09:32
21° 8' 02" S 42° 22' 5,98" O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:

MAYKO TORRES
BOALENTO:10683296612
3296612

MAYKO TORRES BOALENTO
Engenheiro Civil
MG0000245271D MG

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 21150/D

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.27
11:42:09 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.06.27
10:22:35 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PATENTIAIS DIVERSOS, NAS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DIGITAIS UTILIZADOS DEB A		Data de Emissão:	27/06/2025
Local da Obra:		CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOMFIM, MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	003/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
				BOLETIM Nº:	PORTAL CEMITÉRIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)




Reforma Fachada Cemitério Senhor Bomfim
06.06.2025 09:32
21°16'17"S 42°22'59"O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bomfim
06.06.2025 09:32
21°16'07"S 42°22'59"O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:

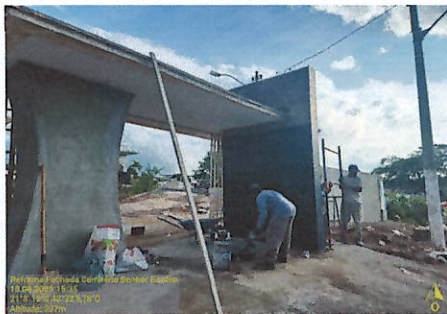

Reforma Fachada Cemitério Senhor Bomfim
06.06.2025 11:51
21°16'10"S 42°22'59"O
Altitude: 237m



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bomfim
06.06.2025 11:51
21°16'10"S 42°22'59"O
Altitude: 237m

OBSERVAÇÕES:



Reforma Fachada Cemitério Senhor Bomfim
06.06.2025 15:18
21°16'13"S 42°22'59"O
Altitude: 236m

OBSERVAÇÕES:

MAYKO TORRES
BOALENTO:10683296612
3296612

Assinado digitalmente por
MAYKO TORRES
BOALENTO:10683296612
Data: 2025.06.30
14:01:00-03'00'

MAYKO TORRES BOALENTO
Engenheiro Civil
MG0000245271D MG

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
588637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.06.27
10:18:57 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.27
11:42:25 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 21150/D

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
73782

Assinado de forma digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.06.27
10:25:13 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS SINTETAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DESENVOLVIDOS UTILIZADOS DEUT A		Data de Emissão: 27/06/2025	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	Local da Obra: CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	BM-01 (OS 003)
	ORDEM DE SERVIÇO: 003/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: PORTAL CEMITÉRIO	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

MAYKO TORRES Assinado digitalmente por MAYKO TORRES
BOALENTO:10683296612
83296612
Data: 2025.06.30 14:00:36-03'00'

MAYKO TORRES BOALENTO
Engenheiro Civil
MG0000245271D MG

EVANDRO MOURA CORREA Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
588637
Data: 2025.06.27 10:19:36 -03'00'



EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ
CRUZ:10550033637
10550033637
Data: 2025.06.27 11:42:37 -03'00'

VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 21150/D

ISABELLA ALVES SOUSA Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
73782
Data: 2025.06.27 10:25:37 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

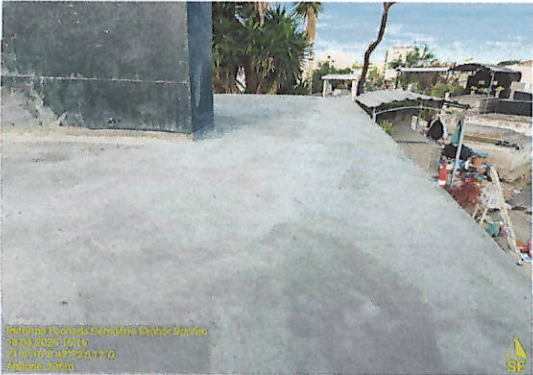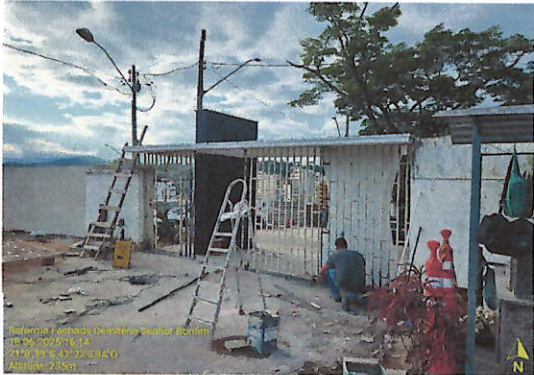 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEBILITADOS UTILIZADOS PEL A				Data de Emissão: 27/06/2025		
Objeto do Contrato:		Local da Obra: CEMITÉRIO NOSSO SENHOR DO BOM FIM, MURIAÉ-MG				CNPJ: 17.947.581/0001-76		
ORDEM DE SERVIÇO: 003/ARP-166/2025		Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO)		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 003 - PORTAL CEMITÉRIO CENTRO)								
 Informação Local: Cemitério Senhor Bomfim 18.04.2025 10:15 21°41'00"S 47°22'00"W Altitude: 255m			 Informação Local: Cemitério Senhor Bomfim 18.06.2025 16:14 21°40'59"S 47°22'00"W Altitude: 255m					
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:					
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:					
OBSERVAÇÕES:			OBSERVAÇÕES:					
MAYKO TORRES Assinado digitalmente por MAYKO TORRES BOALENTO:10683296612 83296612 14:00:02-03'00" MAYKO TORRES BOALENTO Engenheiro Civil MG0000245271D MG			EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONSECA:10449588637 588637 10:20:08-03'00" EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG		VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ CRUZ:10550033637 11:42:55-03'00" VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 21150/D		ISABELLA ALVES SOUSA Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782 10:26:05-03'00" ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
